

Plan complet de recette, test réel, déploiement & migration en production


Nouvelle version multiservices de la plateforme **UPJUNOO PRO** — Transport VTC, Livraison, Fret urbain, Location, Partenaires, Franchises & Central.

Version 1.0

Préparation • Recette • Test réel • Migration

Juin 2026

JALON CLÉ : DIMANCHE 21 JUIN 2026 — JOURNÉE DE TEST RÉEL — 40 ENGINs

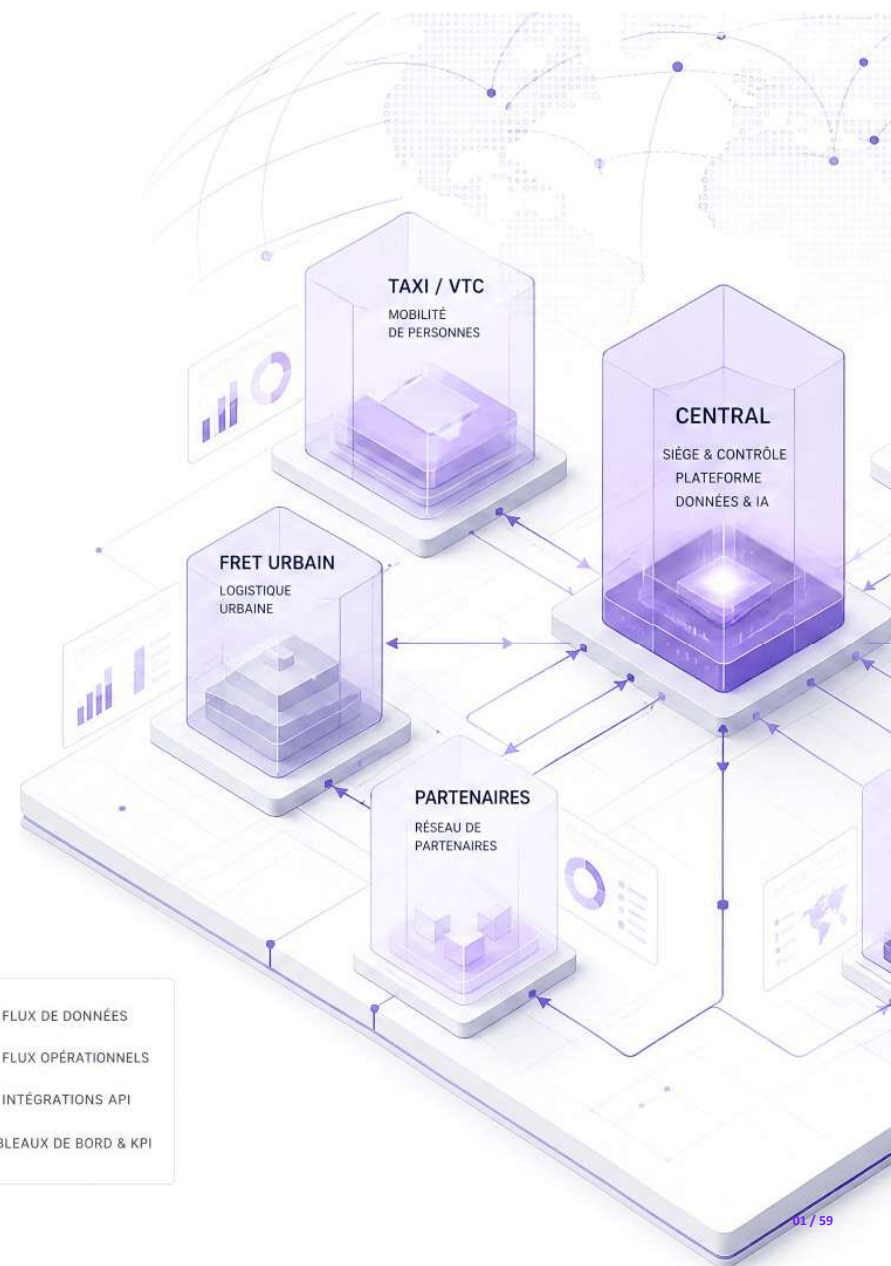

Contexte général · §1

Une version actuelle qui présente des dysfonctionnements structurels — un redéveloppement total a été engagé.

La version de base de UPJUNOO PRO actuellement en production présente plusieurs dysfonctionnements **techniques, fonctionnels, ergonomiques, financiers et opérationnels**. Ces dysfonctionnements ont un impact direct sur la qualité du service, la stabilité de la plateforme, l'expérience utilisateur, la fiabilité des données, la traçabilité financière et la capacité d'exploitation à grande échelle.

01 · TECHNIQUE

Instabilité & bugs récurrents

Crashes, latence, échecs API, géolocalisation imprécise, imprécise, OTP intermittent.

02 · FONCTIONNEL

Parcours incomplets

Statuts incohérents, annulations mal gérées, notifications absentes ou tardives.

03 · FINANCIER

Traçabilité fragile

Confusion entre recette course, recharge wallet et commission plateforme ; soldes incohérents.

04 · OPÉRATIONNEL

Exploitation limitée

Supervision partielle, reporting fragmenté, escalade escalade lente, impossibilité de monter en charge. charge.

→ Réponse de l'éditeur

Redéveloppement total de la plateforme — nouvelle version multiservices en phase finale.

La plateforme étant multiservices, la recette doit couvrir **tous les services et tous les profils** — pas uniquement le module VTC — avant tout basculement vers la production.

Sommaire

Structure du document — 15 parties, 59 sections

I	Objectifs & principes	§2 à §4 · Slides 04 → 07	VI	Use cases de recette	§17 · Slides 30 → 45 · 29 use cases	XI	Plan de migration production	§28 à §30 · Slides 54 → 55
II	Périmètre multiservices	§5 · Slides 08 → 15	VII	Journée test réel — 40 engins	§18 à §20 · Slides 46 → 48 · 21 juin 2026	XII	Basculement sans impact	§31 à §33 · Slides 56 → 57
III	Profils utilisateurs	§6 à §11 · Slides 16 → 21	VIII	Planning détaillé J-3 → J+4	§21 · Slides 49 → 50	XIII	Suivi post-déploiement	§34 · Slide 58 · Hypercare 15-30 j
IV	Environnement préproduction	§12 à §14 · Slides 22 → 26	IX	Critères de validation	§22 à §25 · Slide 51	XIV	Livrables attendus	§35 à §36 · Slide 58
V	Organisation recette	§15 à §16 · Slides 27 → 29	X	Gestion des anomalies	§26 à §27 · Slides 52 → 53	XV	Conclusion & feuille de route	Slide 59

J0

Jalon clé du document — Dimanche 21 juin 2026

Journée de test réel multiservices avec 40 engins, 30-40 clients testeurs, partenaires, franchise, équipes support, finance, technique & direction.

20 taxis · 10 motos · 5 location · 5 fret

2. Objectifs du document

14 objectifs structurant la démarche de recette & migration.

01

Organiser la recette complète de la nouvelle version

02

Définir les prérequis techniques et infrastructures préprod

03

Prendre en compte tous les services de la plateforme

04

Détailler les fonctionnalités à tester par profil utilisateur

05

Formaliser les scénarios de recette en use cases

06

Organiser une journée de test réel avec ~40 engins

07

Tester les parcours clients, chauffeurs, livreurs, partenaires

08

Vérifier la fiabilité des modules de reporting

09

Vérifier commissions, wallet, paiement, recharge & traçabilité

10

Préparer le plan de migration des données existantes

11

Garantir un basculement sans perte de données utilisateurs

12

Réduire les risques de rupture de service

13

Mettre en place une démarche progressive, contrôlée & réversible

14

Produire une base de décision claire pour la mise en production

Périmètre couvert

Transport / Taxi / VTC

Livraison

Fret urbain

Location véhicules

Chauffeurs

Livreurs

Clients

Partenaires

Franchises

Central / Siège

Support

Finances

Wallet & recharge

Reporting

Notifications

3. Objectifs opérationnels spécifiques

Ce que la nouvelle version doit confirmer en sortie de recette.

La démarche de recette doit permettre de confirmer formellement, élément par élément, que la nouvelle version :

Corrige les dysfonctionnements de la version actuelle

Répond aux besoins réels de UPJUNOO PRO

Est techniquement stable en exploitation continue

Permet l'exploitation multiservices (transport, livraison, fret, location)

Permet le suivi des activités par profil (client, chauffeur, livreur, partenaire, franchise)

Permet le suivi financier des commissions & leur répartition

Permet la gestion des partenaires et de leurs flottes

Permet la gestion des franchises et de leurs zones

Permet une supervision centrale efficace

Permet un reporting fiable, exportable et consolidé

Permet la migration sécurisée des données existantes

Critère final

0/blocage

La plateforme peut être utilisée en exploitation réelle sans blocage majeur.

Aucun parcours critique ne doit s'interrompre — un client lance une course, un chauffeur l'accepte et la termine, la commission est débitée correctement, le partenaire voit son chauffeur, la franchise voit sa zone, le central voit le total. De bout en bout. Sans intervention manuelle.

4. Principes directeurs · 1/2

Quatre garde-fous structurels avant tout passage en production.

4.1 Recette obligatoire avant production

Aucune mise en production complète ne doit être réalisée sans recette **fonctionnelle, technique, financière et opérationnelle** validée en environnement préproduction. La validation s'appuie sur des livrables traçables et un procès-verbal Go / No-Go signé.

4.2 Préproduction représentative de la production

L'environnement de préproduction doit être un **miroir contrôlé de la production** : mêmes logiques de données, mêmes accès et rôles, mêmes services externes (SMS, push, paiement), mêmes flux et reporting — uniquement isolé pour ne pas impacter les utilisateurs réels.

4.3 Simulation réelle contrôlée

Avant toute généralisation, une **journée de test réel** est organisée avec ~40 engins, des clients clients testeurs, des chauffeurs, des livreurs, des partenaires et l'équipe centrale. Elle simule l'exploitation sans engagement commercial.

Dimanche 21 juin 2026

4.4 Protection des données existantes

Les utilisateurs déjà inscrits ne doivent subir **ni perte de compte, ni perte de données, ni perte de solde, ni obligation injustifiée** de recréer leur profil. Les rattachements partenaires / franchises et les historiques critiques sont conservés.

4. Principes directeurs · 2/2

Traçabilité, progressivité et réversibilité — les trois piliers du basculement.

4.5

Traçabilité complète

Toutes les anomalies, validations, corrections, tests, résultats et arbitrages doivent être **documentés et horodatés**.

- Registre des anomalies versionné
- Procès-verbaux signés par phase
- Logs techniques conservés
- Bournaux financiers exportés
- Décisions de Go / No-Go archivées

4.6

Basculement progressif

Le passage en production se fait par **vagues successives**, jamais en bloc.

- 01 Phase pilote
- 02 Migration contrôlée
- 03 Généralisation
- 04 Hypercare 15-30 jours

Chaque palier valide les indicateurs techniques, opérationnels et financiers avant financiers avant d'autoriser le palier suivant.

4.7

Réversibilité

Un **plan de retour arrière** est disponible et testé. Il permet de réactiver l'ancienne version si une anomalie critique survient pendant ou après le basculement.

Déclencheurs

- Connexion impossible pour la majorité
- Courses ou livraisons impossibles
- Wallets incohérents
- Données perdues
- Commissions fausses

→ Voir slide 53 pour le plan détaillé

5. Périmètre multiservices

UPJUNOO PRO est une plateforme intégrée — sept domaines à recetter conjointement.

La recette doit traiter la plateforme comme un système cohérent — chaque service partage le wallet, la commission, la géolocalisation, l'authentification et le reporting central.

5.1 Transport · Taxi numérique · VTC

5.2 Livraison

5.3 Fret urbain

5.4 Location de véhicules

5.5 Gestion des partenaires

5.6 Gestion des franchises

5.7 Central · Siège



5.1 · Service à recetter

Transport / Taxi numérique / VTC — 15 fonctionnalités critiques.

Mise en relation entre un client et un chauffeur pour un déplacement urbain ou interurbain. Service historique de la plateforme — recette critique.

Cycle de vie complet d'une course Taxi / VTC

11 étapes clés – du besoin de déplacement à l'historique et la notation

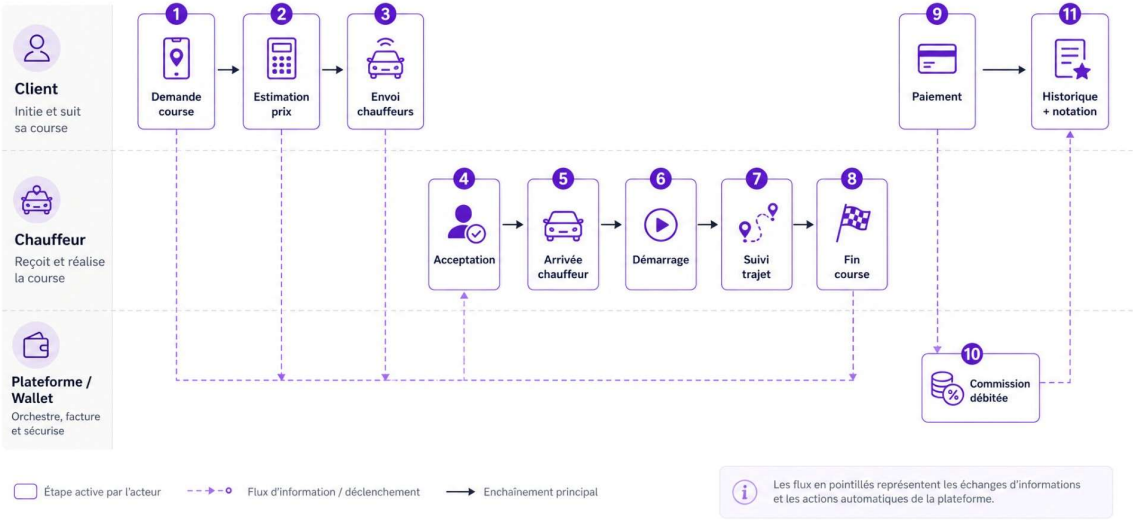


Fig. 9.1 — Workflow complet d'une course VTC, de la demande client à la commission débitée

15 fonctionnalités principales à tester

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 01 Demande de course | 02 Géolocalisation client |
| 03 Géolocalisation chauffeur | 04 Estimation du prix |
| 05 Choix de catégorie | 06 Acceptation de course |
| 07 Arrivée chauffeur | 08 Démarrage de course |
| 09 Suivi du trajet | 10 Fin de course |
| 11 Paiement | 12 Débit de commission |
| 13 Historique | 14 Notation |
| 15 Réclamation | |

Use cases associés

- UC-T01 UC-T02 UC-T03 UC-T04 UC-T05

Voir slides 31-32 pour le détail des scénarios.

Criticité : Critique 20 taxis/VTC en test réel

5.2 · Service à recetter

Livraison — 14 fonctionnalités, du colis à la preuve de livraison.

Prise en charge, transport et livraison d'un colis, document, article ou commande, par un livreur affecté à la mission.


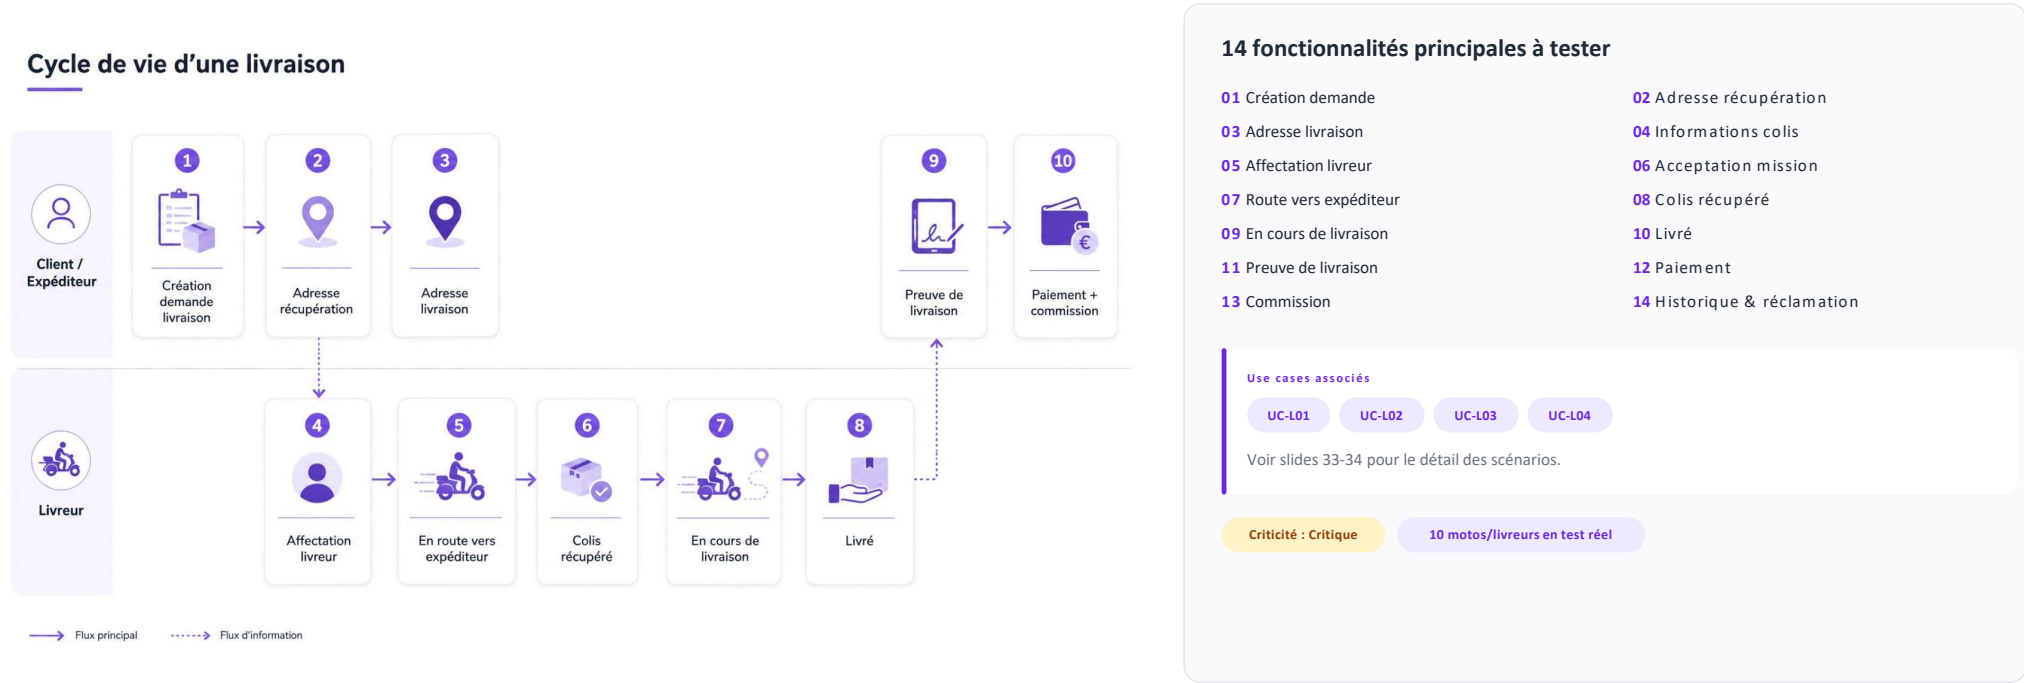


Fig. 10.1 — Cycle complet d'une livraison, de la demande client à la preuve de livraison

5.3 · Service à recetter

Fret urbain — circuit partenaire-centrique avec devis avant affectation.

La demande de fret est reçue et traitée par le partenaire flotte fret (et non directement par un chauffeur). Le partenaire analyse la demande, **envoie un devis** au client, puis affecte un chauffeur de sa propre flotte une fois le devis accepté.

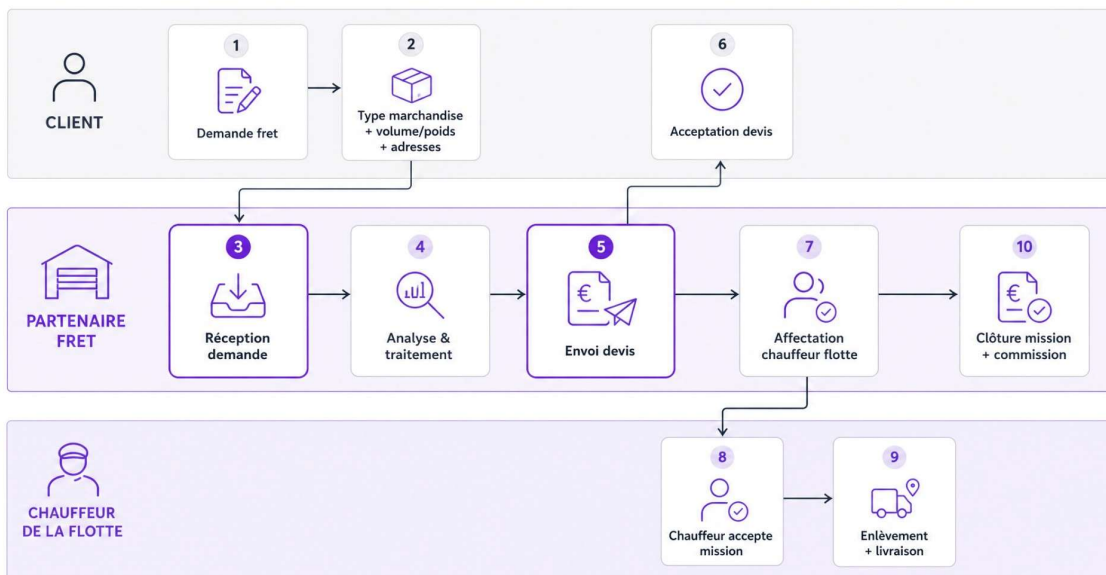

14 fonctionnalités à tester

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|---------------------------------|
| 01 | Création demande fret (client) | 02 | Type de marchandise |
| 03 | Volume / poids estimatif | 04 | Type véhicule requis |
| 05 | Adresse d'enlèvement | 06 | Adresse de livraison |
| 07 | Réception côté partenaire | 08 | Analyse & traitement partenaire |
| 09 | Envoi du devis au client | 10 | Acceptation devis (client) |
| 11 | Affectation chauffeur flotte | 12 | Suivi transport |
| 13 | Clôture mission | 14 | Reporting & commission |

Spécificité du circuit fret

Contrairement au transport VTC où la demande est diffusée directement aux chauffeurs, le fret passe d'abord par le partenaire qui maîtrise sa flotte, ses capacités véhicule et sa tarification. Le devis est une étape obligatoire.

Use cases associés

- UC-F01 UC-F02

Criticité : Majeure


5 véhicules fret en test

Fig. 11.1 — Workflow fret : demande client → réception partenaire → devis → affectation chauffeur flotte

5.4 · Service à recetter

Location de véhicules — 10 fonctionnalités, avec ou sans chauffeur.

Mise à disposition de véhicules selon le modèle opérationnel retenu — réservation simple ou avec chauffeur, validée par le partenaire flotte ou l'administrateur.

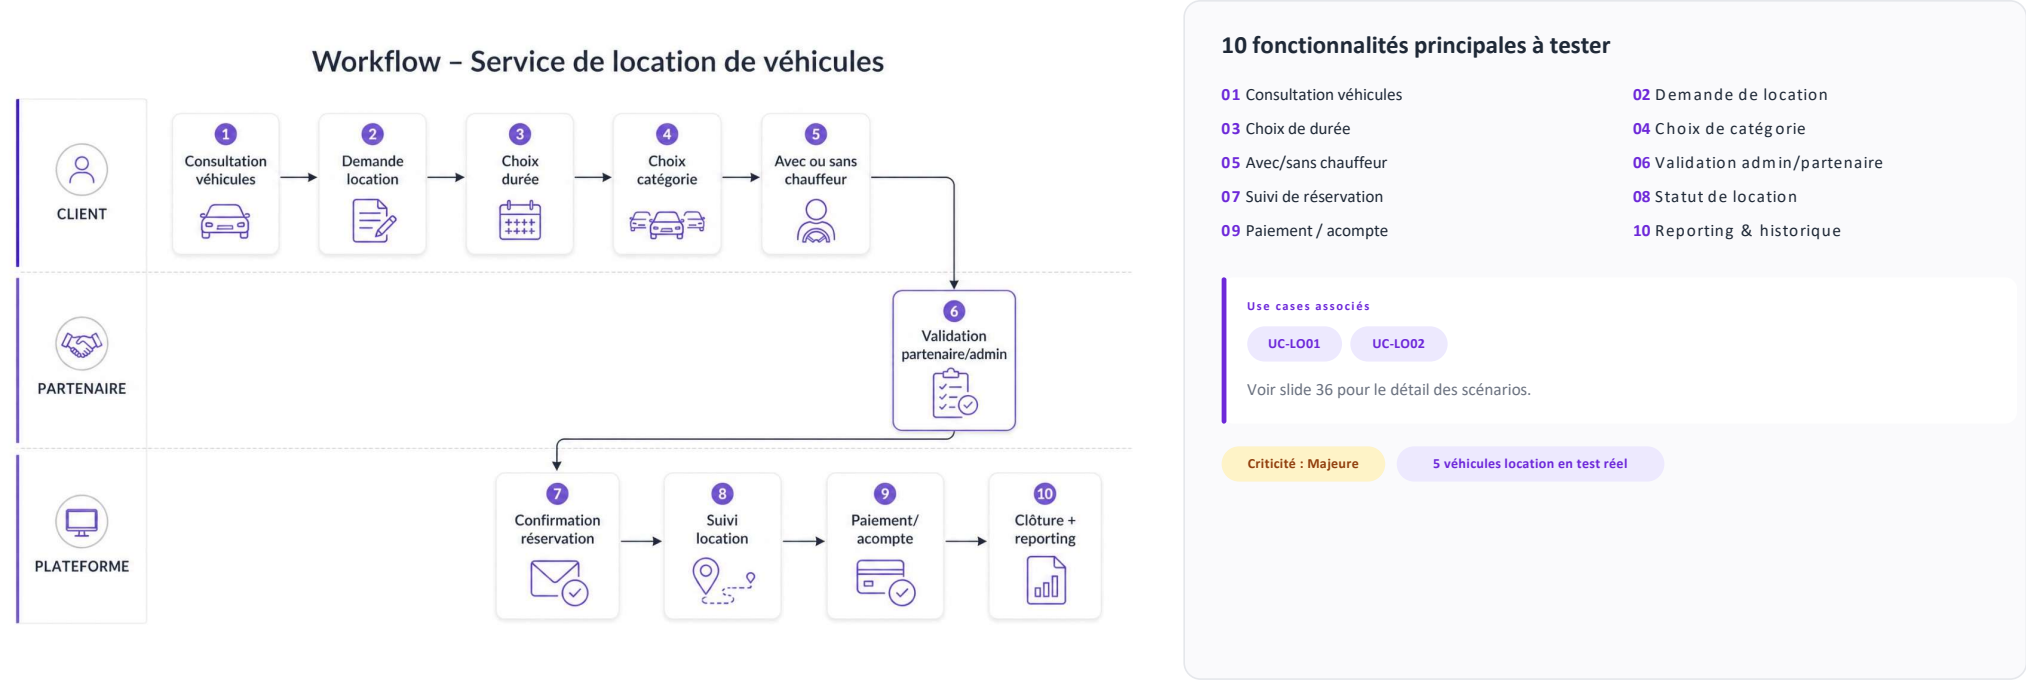

5.5 · Service à recetter

Partenaires — portefeuille propre rechargeable par mobile money ou carte.

Les partenaires disposent de leur **propre portefeuille** rechargeable par **mobile money OU carte bancaire**, puis utilisent ce wallet pour recharger les chauffeurs de leur flotte en cascade.

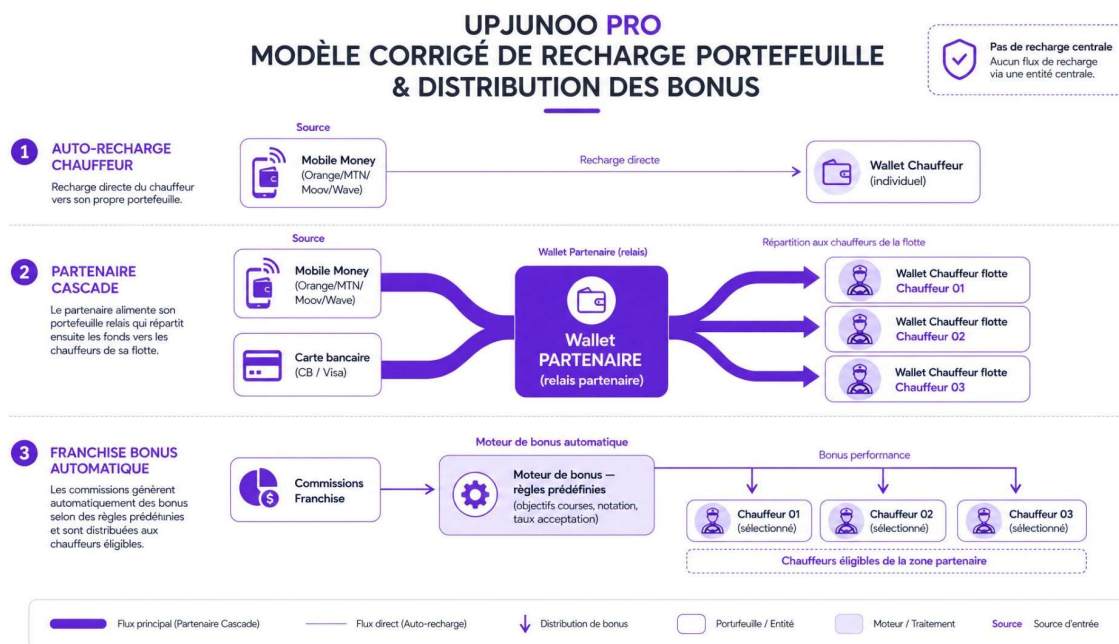


Fig. 13.1 — Recharge cascade : Mobile Money / Carte bancaire → Wallet partenaire → Wallets chauffeurs de la flotte

13 fonctionnalités principales

- Création du compte partenaire
- Validation par l'admin central
- Attachement chauffeurs & véhicules
- Suivi d'activité chauffeurs & flotte
- Suivi revenus, commissions, performance
- Rapporting par période & service
- Gestion documents véhicule / chauffeur

Recharge wallet partenaire — Mobile Money

Recharge wallet partenaire — Carte bancaire (CB / Visa)

Recharge chauffeurs de la flotte (cascade)

- Réception & traitement demandes fret + devis
- Validation demandes location
- Communication avec central & réclamations

2 moyens d'alimentation

Mobile Money

Carte bancaire

UC-P01

UC-P02

UC-FIN01

5.6 · Service à recetter

Franchises — supervision de zone + reversement automatique de bonus.

La franchise supervise sa zone géographique, perçoit ses commissions et **reverse automatiquement des bonus de performance aux chauffeurs** selon des indicateurs prédéfinis (notation, taux acceptance, volume).

13 fonctionnalités principales à tester

- 01 Gestion & paramétrage de zone

02 Suivi des partenaires

03 Suivi des chauffeurs

04 Suivi des livreurs

05 Suivi des clients

06 Suivi courses & livraisons

07 Perception des commissions zone

08 Reporting opérationnel

09 Reporting financier

10 Paramétrage règles bonus performance

11 Reversement bonus automatique

12 Gestion incidents zone

13 Escalade vers central

Moteur de bonus — indicateurs prédéfinis

- Nombre de courses ≥ seuil

→ Note moyenne ≥ 4.5 / 5

→ Taux acceptance ≥ 90 %

→ Taux annulation ≤ 5 %
- Le moteur évalue automatiquement les chauffeurs en fin de période et crédite leur wallet sans intervention manuelle.

Criticité : Critique

UC-FR01 · UC-FR02

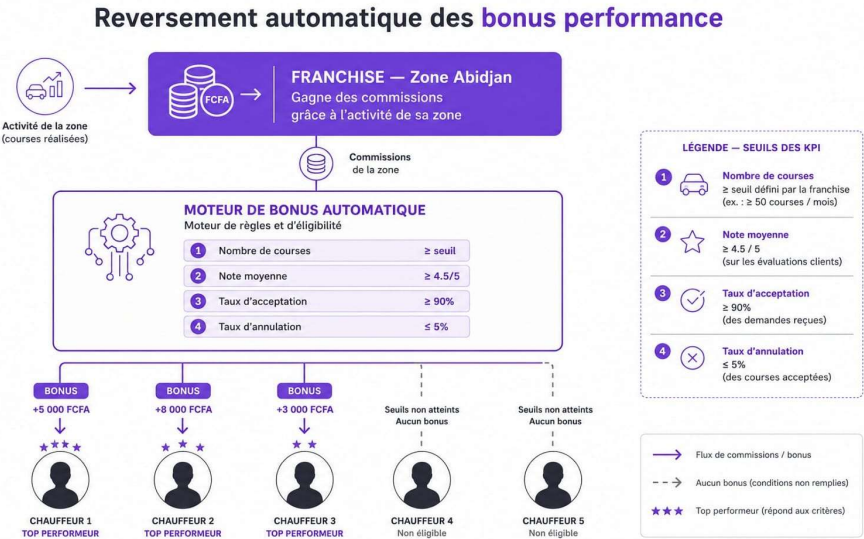


Fig. 14.1 — Reversement automatique des bonus aux chauffeurs selon indicateurs prédéfinis

5.7 · Service à recetter

Central / Siège — supervision globale & paramétrage · 18 fonctionnalités.

Le central **paramètre tarifs, commissions et règles de bonus**, supervise toutes les opérations, gère les wallets, audite les transactions et arbitre les escalades. **Il NE recharge PAS les wallets des chauffeurs** — cette opération relève exclusivement du partenaire ou de l'auto-recharge.

01 Administration globale	02 Supervision tous services	03 Gestion des franchises	04 Gestion des partenaires
05 Gestion des chauffeurs	06 Gestion des livreurs	07 Gestion des clients	08 Paramétrage des tarifs
09 Paramétrage commissions	10 Paramétrage règles bonus	11 Paramétrage zones	12 Supervision wallets (lecture seule)
13 Gestion réclamations	14 Reporting consolidé	15 Export financier	16 Audit des opérations
17 Gestion des droits & rôles	18 Conformité & logs		

**Règle stricte — séparation des responsabilités**


Le central NE recharge PAS les wallets des chauffeurs ni des livreurs.

Sa supervision financière est en **lecture seule**. Les recharges sont l'affaire des partenaires (cascade) ou des chauffeurs eux-mêmes (auto-recharge).

UC-C01 · UC-C02 · UC-A01

Diagramme use case · vue globale

Six acteurs interagissent avec la plateforme — cartographie des cas d'usage.

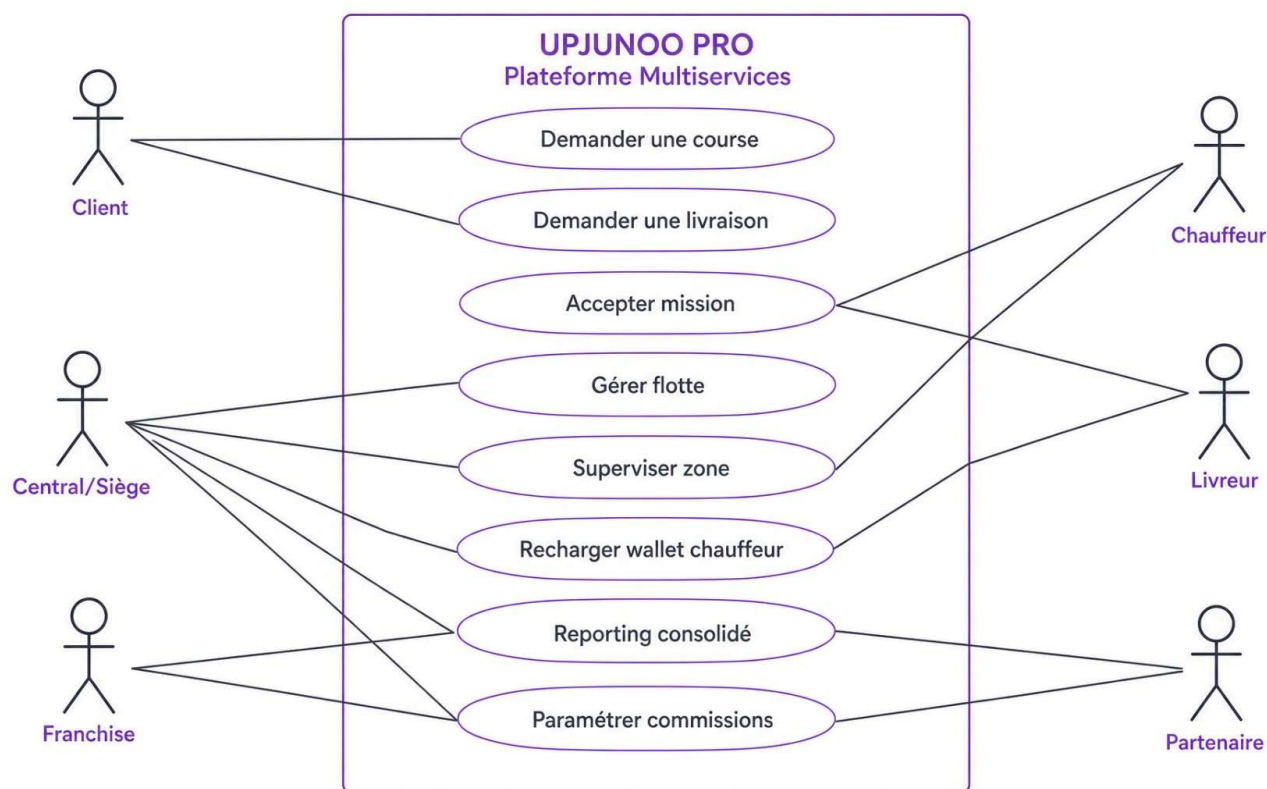

6 acteurs principaux

Client

Consomme les services

Chauffeur

Transport / location avec chauffeur

Livreur

Missions de livraison

Partenaire

Flotte chauffeurs & véhicules

Franchise

Supervision zone géographique

Central / Siège

Vue globale, paramétrage, audit

+ Profils techniques

Support · Finance · Conformité · Reporting · Direction

6. Profil Client

Le client — utilisateur final qui consomme les services de la plateforme.

6.1 · Fonctionnalités clés à tester

16 fonctionnalités

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01 Création de compte | 02 Connexion par OTP |
| 03 Mise à jour du profil | 04 Demande de course |
| 05 Demande de livraison | 06 Demande de fret |
| 07 Demande de location | 08 Choix d'un service |
| 09 Suivi en temps réel | 10 Consultation prix estimatif |
| 11 Paiement (options disponibles) | 12 Historique des demandes |
| 13 Annulation | 14 Notation |
| 15 Réclamation | 16 Assistance |

Test réel

20 clients internes + 20 clients testeurs externes — opérateurs Orange, MTN, Moov & Wave.

6.2 · Reporting attendu côté client

Le client doit pouvoir consulter

- Ses courses
- Ses livraisons
- Ses réservations (location, fret)
- Ses dépenses cumulées
- Ses statuts de demande en cours
- Ses réclamations & leur statut
- Ses notifications

UC-01 Création

UC-T01 Demande

7. Profil Chauffeur · Conducteur

Le chauffeur — wallet, commission, recharge : un parcours intégralement financier.

Affecté aux courses VTC, au fret ou aux locations avec chauffeur. Peut **se recharger lui-même**, recevoir une recharge par son partenaire, sa franchise ou le central.

7.1 · Fonctionnalités clés à tester

18 fonctionnalités

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 01 Inscription | 02 Soumission documents |
| 03 Validation administrative | 04 Gestion du véhicule |
| 05 Disponibilité on/off | 06 Réception des demandes |
| 07 Acceptation/refus course | 08 Navigation vers client |
| 09 Démarrage de course | 10 Fin de course |
| 11 Encaissement client | 12 Débit de commission |
| 13 Consultation wallet | 14 Recharge wallet |
| 15 Historique d'activité | 16 Réclamations |
| 17 Notifications | 18 Suspension / réactivation |

3 voies d'alimentation wallet chauffeur

1 · Auto-recharge mobile money

2 · Par son partenaire (cascade)

3 · Bonus franchise auto

Le partenaire recharge son propre wallet (mobile money / carte) puis crédite ses chauffeurs en cascade. La franchise reverse des **bonus de performance** automatiques. **Le central ne recharge pas les chauffeurs.**

7.2 · Reporting attendu côté chauffeur

9 indicateurs financiers & opérationnels

- | | |
|---|-------------------------------|
| 01
Nombre de courses réalisées | 02
Montant brut encaissé |
| 03
Commissions prélevées | 04
Solde wallet temps réel |
| 05
Historique recharges | 06
Historique des débits |
| 07
Notes reçues | 08
Annulations |
| 09
Statut du compte (actif / suspendu / en attente document) | |

UC-FIN01

UC-FIN02

UC-FIN04

8. Profil Livreur

Le livreur — un parcours dédié, du retrait à la preuve de livraison.

Affecté aux missions de livraison. Wallet et recharge identiques au chauffeur ; les voies de recharge incluent l'auto-recharge, le partenaire, la franchise et le central.

8.1 · Fonctionnalités clés à tester

14 fonctionnalités

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 01 Inscription | 02 Validation du profil |
| 03 Disponibilité on/off | 04 Réception demande |
| 05 Acceptation mission | 06 Vers expéditeur |
| 07 Confirmation récupération | 08 Vers destinataire |
| 09 Confirmation livraison | 10 Preuve de livraison |
| 11 Paiement | 12 Commission |
| 13 Historique | 14 Réclamations |

Wallet livreur — 3 voies d'alimentation

Auto-recharge mobile money

Depuis wallet partenaire

Bonus franchise auto

Le partenaire recharge son propre wallet (mobile money / carte), puis crédite ses livreurs. La franchise reverse automatiquement des bonus de performance.
Le central ne recharge pas les livreurs.

8.2 · Reporting attendu côté livreur

7 indicateurs clés

01 Nombre de livraisons

02 Montants encaissés

03 Commissions

04 Solde wallet

05 Statuts des livraisons

06 Historique

07 Réclamations

UC-L01

UC-L02

UC-L03

9. & 10. Partenaire · Franchise

Deux profils superviseurs — flotte directe versus zone géographique.

9 Profil Partenaire

Propriétaire de flotte, entreprise, coopérative — il rattache chauffeurs et véhicules à la plateforme.

Fonctionnalités à tester

- Création de compte partenaire
- Validation par l'administration centrale
- Ajout / rattachement de chauffeurs & véhicules
- Suivi des chauffeurs actifs & véhicules actifs
- Suivi des courses, livraisons, revenus, commissions

Recharge wallet d'un chauffeur de sa flotte

- Export des rapports & performance par période

Reporting attendu

- Nb chauffeurs / véhicules rattachés
- Nb de courses par chauffeur
- Montant total d'activité & commissions dues/prélevées
- Performance par période · activité par service
- Statuts chauffeurs / véhicules · indicateurs de conformité

UC-P01

UC-P02

10 Profil Franchise

Entité de gestion locale, régionale ou nationale. Supervise **tous les partenaires** de sa zone.

Fonctionnalités à tester

- Gestion d'une zone & paramétrage
- Suivi partenaires, chauffeurs, livreurs, clients
- Suivi des services actifs · revenus · commissions
- Reporting opérationnel & financier par zone
- **Recharge wallets chauffeurs / partenaires de sa zone**
- Gestion des incidents & escalade vers central

Reporting attendu (14 indicateurs)

Activité globale zone · Nb partenaires, chauffeurs, livreurs, clients actifs · Courses, livraisons, fret, locations · Chiffre d'activité · Commissions · Taux Commissions · Taux d'annulation · Incidents · Réclamations

UC-FR01

11. Profil Central · Siège

Le Central — vue consolidée & 22 indicateurs de reporting global.

Périmètre

7 profils

+ comptes techniques (super-admin, exploitation, finance, support, conformité, reporting, direction)

Fonctionnalités à tester

19 fonctions

Admin, supervision, paramétrage, finance, audit (voir slide 15)

Reporting consolidé

22 indicateurs

Activité, finance, opérationnel, qualité


11.2 · 22 rapports consolidés à disposition du central

01 Activité totale plateforme	02 Activité par service	03 Activité par zone	04 Activité par franchise
05 Activité par partenaire	06 Activité par chauffeur	07 Activité par livreur	08 Recettes brutes
09 Commissions plateforme	10 Commissions partenaires	11 Commissions franchises	12 Wallets & soldes
13 Recharges wallet	14 Débits	15 Transactions	16 Incidents
17 Réclamations	18 Taux d'annulation	19 Taux d'acceptation	20 Taux finalisation
21 Audit & logs	22 Conformité globale	→ Exports comptables & financiers — formats CSV / Excel	

12. & 13.1 · Architecture préproduction

La préproduction — un miroir contrôlé de la future production.

Recette obligatoire en environnement isolé, identique fonctionnellement à la production, sans impact sur les utilisateurs réels.

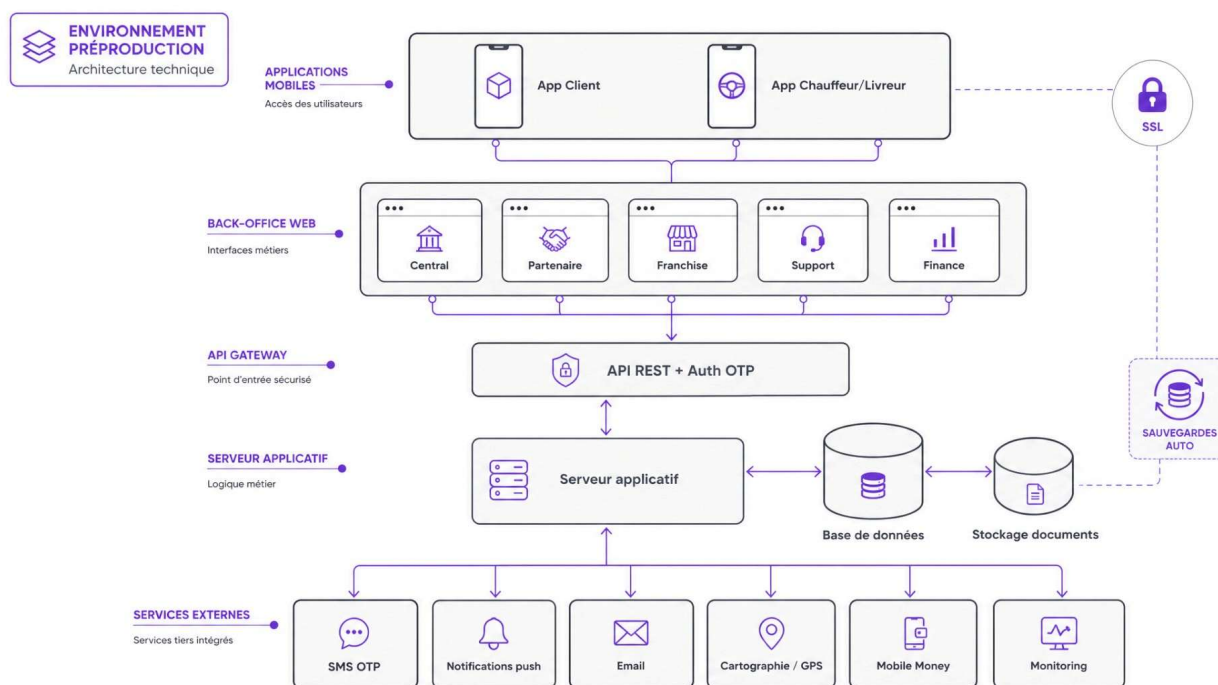

9 composants serveurs requis

- Serveur applicatif dédié
- Serveur ou service BDD dédié
- Espace de stockage documents & images
- Certificat SSL actif
- Nom de domaine ou sous-domaine de test
- Configuration réseau sécurisée
- Accès limité aux équipes autorisées
- Sauvegardes automatiques
- Capacité de restauration testée

Principe directeur

Les données sont des données de test ou anonymisées. Aucune donnée de production réelle ne circule en préprod sans contrôle.

Isolation réseau


Sauvegardes auto

Restauration testée

Fig. 22.1 — Schéma d'architecture préproduction (applications mobiles, back-office web, API, BDD, stockage, services externes)

13.2 · Base de données préproduction

17 tables — structure identique ou proche de la future production.

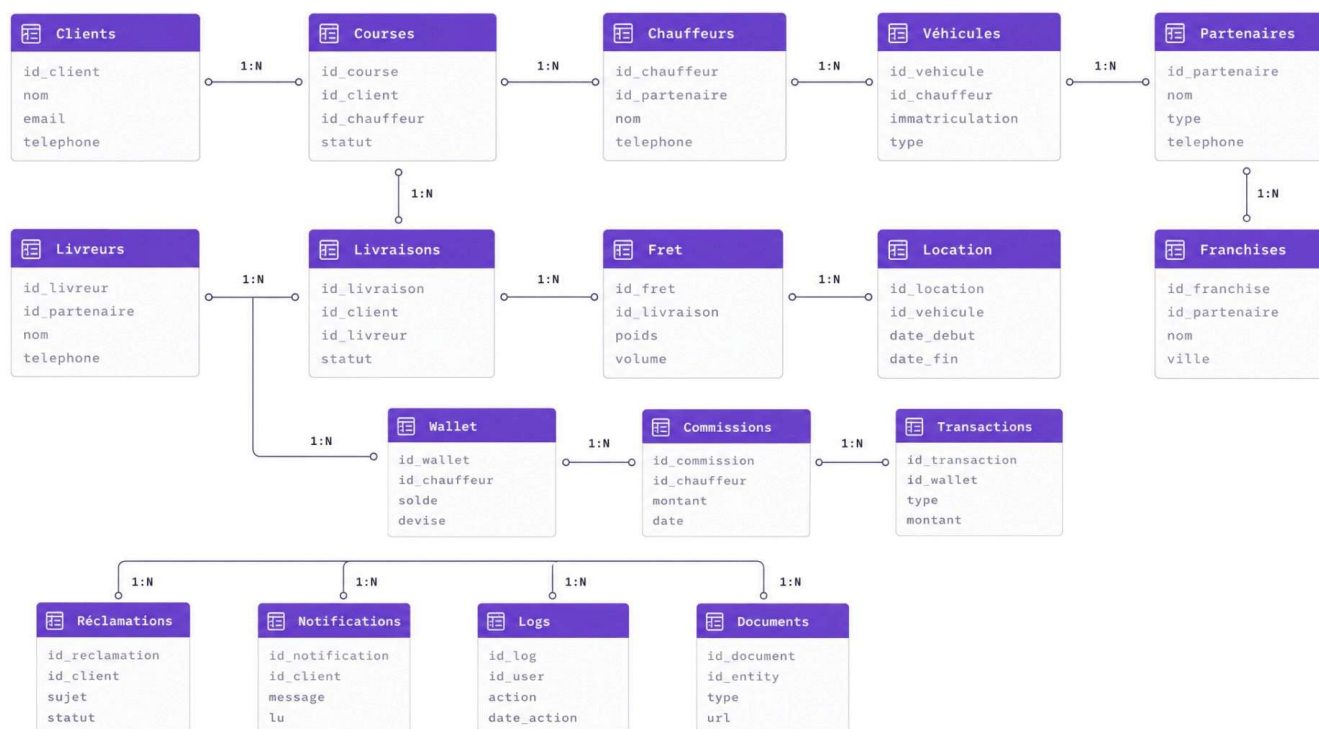

17 tables à préparer

- | | |
|------------------|-----------------|
| 01 Clients | 02 Chauffeurs |
| 03 Livreurs | 04 Partenaires |
| 05 Franchises | 06 Véhicules |
| 07 Courses | 08 Livraisons |
| 09 Fret | 10 Location |
| 11 Wallet | 12 Commissions |
| 13 Transactions | 14 Réclamations |
| 15 Notifications | 16 Logs |
| 17 Documents | |

Données peuplant la base

- Données de test contrôlées
- Copie anonymisée d'échantillons production
- Comptes pilotes pour tous les profils
- Soldes et historiques initiaux

Fig. 23.1 — Cartographie des 17 tables relationnelles de la base préproduction

13.3 & 13.4 · Applications mobiles & back-office

2 applications mobiles + 8 interfaces web disponibles en préproduction.

13.3 Applications mobiles préproduction



App Client

Multiservices : transport, livraison, fret, location



App Chauffeur / Livreur

Mission, wallet, recharge, historique

Disponibilité requise

- Version Android installable
- Fichier APK ou lien de test
- Numéro de version clairement identifié
- Journal des changements par version
- Procédure d'installation / mise à jour / désinstallation

13.4 8 interfaces back-office & web

01

Administrateur central

02

Support

03

Finance

04

Partenaire

05

Franchise

06

Reporting

07

Paramétrage

08

Suivi anomalies

Sécurité & accès — §13.6

- Accès administrateur sécurisé · Gestion des rôles
- OTP / mots de passe fonctionnels · Limitation accès techniques
- Journalisation connexions & actions sensibles
- Protection documents · Sauvegarde & restauration

13.5 · Services externes à connecter

12 services externes à configurer en mode test ou contrôlé.

Chaque service est connecté avec des clés de test, des numéros simulés ou des passerelles sandbox. Aucune transaction réelle ni envoi production.

01

SMS OTP

Authentication client & chauffeur. Numéros test Orange, MTN, MTN, Moov, Wave.

02

Notifications push

Affectations, statuts, alertes. Test mobile en condition réelle.

03

Email transactionnel

Confirmations, factures, rapports périodiques.

04

Cartographie

Visualisation des itinéraires, calcul de distance & ETA.

05

Géolocalisation

Position client / chauffeur temps réel. Mode test & GPS réel.

06

Mobile Money

Paieement client & recharge wallet — Orange Money, MTN MoMo, MoMo, Moov, Wave.

07

Recharge wallet

Service interne de gestion des recharges (4 voies : auto, partenaire, partenaire, franchise, central).

08

Passerelle paiement test

Mode sandbox sans débit réel — simulation des cas nominaux et nominaux et d'échec.

09

Stockage documents

Documents chauffeur, véhicule, partenaire — bucket dédié préprod. préprod.

10

Service de logs

Centralisation des journaux serveurs & APIs pour debug.

11

Monitoring serveur

CPU, mémoire, temps de réponse, disponibilité applicative.

12

Outil d'alerte technique

Remontée automatique des incidents critiques vers l'équipe d'astreinte.

14. Données de test nécessaires

~90 comptes test couvrant tous les profils et opérateurs mobiles.

Catégorie de compte	Nombre	Détail / objectif
Clients internes	20	Testeurs de l'équipe projet, exécutent les use cases en suivi rapproché.
Clients testeurs externes	20	Utilisateurs sélectionnés hors équipe — feedback ergonomie.
Clients Orange / MTN / Moov / Wave	Tous opérateurs	Diversité OTP & recharge mobile money — couverture complète.
Clients par service	Mix 4 services	Transport · livraison · location · fret — répartition équilibrée.
Chauffeurs taxi / VTC	20	Tester le transport de personnes — service principal.
Livreurs	10	Tester la livraison (motos / petits véhicules).
Véhicules location avec chauffeur	5	Tester la réservation et la mise à disposition.
Véhicules fret urbain	5	Tester les demandes de transport de marchandises.
Partenaires pilotes	3 à 5	Plusieurs chauffeurs, plusieurs véhicules, 1 par type d'activité.
Compte franchise test	1	Zone Abidjan principale (+1 zone secondaire optionnelle).

40 ENGINES

Total flotte de test réel

20 taxis/VTC + 10 motos livreurs + 5 location + 5 fret = couverture multiservices intégrale.

~90 comptes test au total

15. Gouvernance de la recette

11 acteurs avec rôles et responsabilités dédiés.

ACTEUR	RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Direction UPJUNOO PRO	Validation stratégique · arbitrage · décision finale Go / No-Go en production.
Chef de projet	Coordination globale · planning · suivi des validations · gestion du registre d'anomalies.
Éditeur	Livraison de la version · corrections techniques · support de niveau 3 · documentation technique.
Équipe technique interne	Contrôle technique · tests API · environnement · logs · monitoring · sécurité.
Équipe exploitation	Tests métiers · supervision terrain · animation chauffeurs / livreurs.
Équipe finance	Tests wallet · commissions · rapports financiers · répartitions plateforme / partenaire / franchise / central.
Équipe support	Tests réclamations · assistance utilisateurs · gestion des incidents en journée test.
Partenaires pilotes	Tests rattachement chauffeurs / véhicules · supervision flotte · recharge wallet de leurs chauffeurs.
Franchises pilotes	Tests reporting zone · supervision locale · escalade vers central.
Chauffeurs / livreurs pilotes	Exécution terrain · acceptation courses / missions · feedback utilisabilité.
Clients testeurs	Simulation des demandes multiservices · notation · réclamation.

16. Méthode de recette

5 niveaux de recette — exécutés séquentiellement, validés en parallèle.

16.1

Technique

Vérifie l'environnement et l'infrastructure.

- Installation des applications
- Connexion serveur
- Disponibilité APIs
- Stabilité BDD
- Logs
- Performance
- Notifications
- Paiement
- Sauvegarde
- Sécurité

16.2

Fonctionnelle

Vérifie les parcours métier.

- Parcours clients
- Parcours chauffeurs
- Parcours livreurs
- Parcours partenaires
- Parcours franchises
- Parcours central
- Règles métier
- Statuts
- Notifications
- Historiques

16.3

Financière

Vérifie wallet, commission, répartition.

- Wallet chauffeur
- Wallet livreur
- Recharge (4 voies)
- Débit commission
- Solde
- Historique transaction
- Part plateforme
- Part partenaire
- Part franchise
- Export comptable

16.4

Opérationnelle

Vérifie la capacité d'exploitation.

- Capacité terrain
- Formation utilisateurs
- Réactivité support
- Suivi des incidents
- Clarté procédures
- Supervision temps réel
- Qualité des rapports

16.5

Reporting

Vérifie tableaux de bord et exports.

- Tableaux de bord
- Données par profil
- Données par service
- Données par période
- Données par zone
- Données par partenaire
- Données par franchise
- Exports
- Cohérence financière
- Cohérence opérationnelle

17. Format standard d'un use case

12 champs structurés — gabarit appliqué à chacun des 29 use cases.

Chaque scénario de test est documenté avec le même squelette pour permettre une exécution répétable, traçable et auditable.

UC-XX

Intitulé du scénario

Modèle

01 · RÉFÉRENCE

Code unique UC-XX

03 · PROFIL CONCERNÉ

Client, chauffeur, livreur, partenaire, franchise, central

05 · PRÉCONDITIONS

État du système avant le test

07 · RÉSULTATS ATTENDUS

Sortie observable du système

09 · CRITICITÉ

Critique · Majeure · Moyenne · Mineure

11 · OBSERVATIONS

Notes du testeur, contexte

02 · SERVICE CONCERNÉ

Transport, livraison, fret, location, finance, central...

04 · OBJECTIF

Hypothèse à vérifier en une phrase

06 · ÉTAPES DE TEST

Séquence numérotée d'actions

08 · CRITÈRES D'ACCEPTATION

Conditions à remplir pour valider

10 · STATUT

À tester · En cours · Validé · KO

12 · ANOMALIES DÉTECTÉES

Référence dans le registre

29 use cases couverts	
UC-01 → UC-03 Transversaux	3
UC-T01 → UC-T05 Transport / VTC	5
UC-L01 → UC-L04 Livraison	4
UC-F01 → UC-F02 Fret urbain	2
UC-LO01 → UC-LO02 Location	2
UC-FIN01 → UC-FIN04 Finance · Wallet	4
UC-P01 → UC-P02 Partenaires	2
UC-FR01 · UC-FR02 Franchise & bonus	2
UC-C01 → UC-C03 Central · Reporting	3
UC-S01 Support	1
UC-A01 (a · b · c) Admin · Paramétrage	3
UC-AU01 Atteinte de l'objectif	1

A. Use cases transversaux

UC-01 · UC-02 · UC-03 — authentification, comptes, droits.

UC-01

Critique

Création d'un compte client

Service : tous · Profil : Client

OBJECTIF

Vérifier qu'un client peut créer un compte et accéder à la plateforme.

ÉTAPES

- Ouvrir l'application client
- Saisir le numéro de téléphone
- Recevoir le code OTP
- Valider le code
- Renseigner profil & enregistrer
- Vérifier le compte dans le back-office

RÉSULTATS ATTENDUS

OTP reçu · compte créé · profil enregistré · compte visible au back-office · client en statut actif, actif.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Le client se connecte et accède aux services sans blocage.

UC-02

Critique

Connexion utilisateur existant

Service : tous · Profils : tous

OBJECTIF

Vérifier que les utilisateurs déjà créés ou migrés peuvent se reconnecter sans perte de données.

ÉTAPES

- Ouvrir l'application ou l'interface web
- Saisir les identifiants
- Valider l'authentification
- Accéder au tableau de bord
- Vérifier les données du profil

RÉSULTATS ATTENDUS

Connexion réussie · données du profil conservées · aucun doublon · droits correctement appliqués.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

L'utilisateur existant accède à son profil sans perte de données.

UC-03

Critique

Gestion des rôles et droits

Service : administration · Profils : central, franchise, partenaire, support, finance

OBJECTIF

Vérifier que chaque profil accède uniquement aux fonctions autorisées.

ÉTAPES

- Connexion compte central · vérifier droits globaux
- Connexion franchise · droits limités à la zone
- Connexion partenaire · droits limités à sa flotte
- Connexion support · accès incidents
- Connexion finance · accès données financières

RÉSULTATS ATTENDUS

Droits cloisonnés · aucun partenaire ne voit les données d'un autre · franchise voit sa zone seulement · central à la vue globale.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Aucun profil n'accède à des données non autorisées.

B. Transport - VTC — partie 1

UC-T01 · UC-T02 — Demande de course et acceptation chauffeur.

UC-T01

Critique

Demande de course client

Service : Transport / Taxi / VTC · Profil : Client

OBJECTIF

Vérifier qu'un client peut demander une course et que la demande est correctement transmise.

PRÉCONDITIONS

Client connecté · chauffeurs disponibles · géolocalisation activée · tarifs configurés.

ÉTAPES

- Choisir le service Transport
- Saisir le point de départ & la destination
- Choisir une catégorie de véhicule
- Vérifier l'estimation du prix affichée
- Confirmer la demande
- Observer la diffusion aux chauffeurs proches

RÉSULTATS ATTENDUS

Demande créée · prix estimatif affiché · chauffeurs proches reçoivent la demande · client voit le statut "recherche".

CRITÈRE D'ACCEPTATION

La course est créée et transmise sans erreur.

UC-T02

Critique

Acceptation de course par chauffeur

Service : Transport / Taxi / VTC · Profil : Chauffeur

OBJECTIF

Vérifier qu'un chauffeur peut accepter une course et que client + back-office voient le même statut.

PRÉCONDITIONS

Chauffeur validé · en ligne · solde wallet conforme aux règles · demande client disponible.

ÉTAPES

- Le chauffeur reçoit la demande (notification push)
- Il consulte les informations (point de départ, destination, prix)
- Il accepte la course
- Le client reçoit la confirmation chauffeur
- Le chauffeur voit l'itinéraire vers le client

RÉSULTATS ATTENDUS

Acceptation enregistrée · statut mis à jour · client informé · chauffeur affecté · course visible au back-office.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Client, chauffeur et back-office voient la même course avec le même statut.

B. Transport · VTC — partie 2

UC-T03 · UC-T04 · UC-T05 — cycle complet et annulations.

UC-T03 Démarrage et fin de course

Service : Transport / Taxi / VTC · Profils : Client, Chauffeur, Central

Critique

ÉTAPES — CYCLE COMPLET

Le chauffeur arrive au point de départ
Il signale son arrivée
Le client monte à bord
Le chauffeur démarre la course
Le trajet est suivi en temps réel

Le chauffeur termine la course
Le prix final est calculé
La commission est calculée & débitée
Le wallet est mis à jour
La course apparaît dans les historiques

RÉSULTATS ATTENDUS

Statuts cohérents · prix correct · commission correcte · wallet à jour · historique client & chauffeur · reporting central.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Une course complète doit pouvoir être réalisée sans blocage, de l'arrivée chauffeur à l'historique.

UC-T04 Annulation client

Majeure

Tester l'annulation d'une course par le client après acceptation chauffeur.

ÉTAPES

Client demande une course
Un chauffeur accepte
Le client annule
Le chauffeur reçoit la notification
Back-office affiche statut annulé · chauffeur redevient disponible

→ Annulation enregistrée · notification envoyée · chauffeur disponible.

UC-T05 Annulation chauffeur

Majeure

Tester l'annulation d'une course par le chauffeur avant arrivée.

ÉTAPES

Le chauffeur accepte une course
Il annule avant arrivée
Le client reçoit la notification
Le système relance ou clôture (selon paramétrage)
Le back-office conserve la trace

→ Client informé · statut cohérent · reporting mis à jour.

C. Livraison — partie 1

UC-L01 · UC-L02 — création de demande et acceptation livreur.

UC-L01

Critique

Création d'une demande de livraison

Service : Livraison · Profil : Client

OBJECTIF

Vérifier qu'un client peut créer une demande de livraison et que celle-ci est affectable à un livreur.

PRÉCONDITIONS

Client connecté · livreurs disponibles · tarification livraison configurée.

ÉTAPES

- Le client choisit le service Livraison
- Il renseigne l'adresse de récupération
- Il renseigne l'adresse de livraison
- Il décrit le colis
- Il valide la demande
- Le système affiche une estimation
- Le client confirme

RÉSULTATS ATTENDUS

Demande créée · prix estimatif affiché · livreurs notifiés · demande visible au back-office.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

La demande doit être affectable à un livreur.

UC-L02

Critique

Acceptation de livraison par livreur

Service : Livraison · Profil : Livreur

OBJECTIF

Vérifier qu'un livreur peut accepter une mission de livraison et que client & back-office sont synchronisés.

PRÉCONDITIONS

Livreur validé · disponible · demande client diffusée.

ÉTAPES

- Le livreur reçoit la demande
- Il consulte les informations (adresses, description, prix)
- Il accepte
- Le client reçoit la confirmation
- Le livreur voit l'itinéraire vers l'expéditeur

RÉSULTATS ATTENDUS

Mission affectée · client informé · statut mis à jour · back-office alimenté.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

La mission est attribuée et synchronisée sur tous les écrans.

C. Livraison — partie 2

UC-L03 · UC-L04 — cycle complet de livraison et gestion de l'échec.

UC-L03

Critique

Récupération & livraison du colis

Service : Livraison · Profils : Client, Livreur, Central

OBJECTIF

Vérifier le cycle complet d'une livraison, de la récupération chez l'expéditeur à la confirmation chez le destinataire.

ÉTAPES — CYCLE COMPLET

Le livreur arrive chez l'expéditeur
Il confirme la récupération
Il se rend chez le destinataire
Il confirme la livraison

Le client reçoit la confirmation
Le système clôture la mission
La commission est calculée

RÉSULTATS ATTENDUS

Statuts cohérents · livraison clôturée · historique disponible · commission calculée · reporting mis à jour.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Une livraison complète peut être réalisée de bout en bout sans intervention manuelle.

FOCUS — PREUVE DE LIVRAISON

Si une preuve de livraison (photo, signature, code) est implémentée, elle est testée séparément en variante du cycle nominal. La preuve est stockée dans la table Documents.

UC-L04

Majeure

Livraison échouée

Cas non nominal — destinataire absent.

OBJECTIF

Tester le cas où une livraison ne peut pas être finalisée et la prise en charge support.

ÉTAPES

Le livreur accepte une mission
Il récupère le colis
Le destinataire est indisponible
Le livreur signale l'échec dans l'app
Le support est alerté en temps réel
Le back-office affiche le statut "livraison échouée"

RÉSULTATS ATTENDUS

Incident enregistré · statut clair · support informé · historique conservé · reprogrammation possible.
possible.

CRITÈRE

Le cas d'échec n'entraîne aucune perte de colis ni de transaction.

UC-F01 · UC-F02 — réception & devis partenaire, puis affectation chauffeur.

UC-F01

Majeure

Création demande & réception partenaire

Service : Fret urbain · Profils : Client, Partenaire fret

OBJECTIF

Vérifier que la demande de fret du client est **reçue par le partenaire** (jamais directement par un chauffeur) et qu'elle apparaît dans son tableau de bord pour traitement.

ÉTAPES

- Le client choisit le service Fret
- Il indique type de marchandise, volume / poids, type véhicule requis
- Il renseigne l'adresse d'enlèvement et l'adresse de livraison
- Il valide la demande — **aucune estimation automatique affichée** (le prix dépendra du devis partenaire)
- La demande est routée au(x) **partenaire(s) fret de la zone**
- Le partenaire reçoit une notification & voit la demande dans son back-office

RÉSULTATS ATTENDUS

Demande créée · client en statut "en attente de devis" · partenaire(s) notifié(s) · demande visible au back-office central.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Aucune demande de fret ne doit être diffusée directement aux chauffeurs avant validation et devis du partenaire.

UC-F02

Majeure

Devis partenaire & affectation chauffeur

Service : Fret urbain · Profils : Partenaire, Client, Chauffeur de la flotte

OBJECTIF

Vérifier le circuit complet : traitement partenaire, envoi devis, acceptation client, affectation chauffeur, démarrage mission.

ÉTAPES

- Le partenaire consulte la demande dans son back-office
- Il analyse : type marchandise, distance, véhicule disponible, calendrier
- Il saisit le **devis** (prix, délai, conditions) et l'envoie au client
- Le client reçoit le devis (notification + détail) et l'accepte ou refuse
- Si accepté : le partenaire affecte un chauffeur de sa flotte
- Le chauffeur reçoit la mission & accepte
- Le suivi mission démarre ; clôture & commission à la fin

RÉSULTATS ATTENDUS

Devis enregistré · client notifié · acceptation tracée · chauffeur affecté uniquement après acceptation · véhicule conforme au besoin · reporting OK.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Aucune affectation possible avant acceptation du devis par le client. Le chauffeur affecté appartient obligatoirement à la flotte du partenaire émetteur.

E. Location de véhicules

UC-LO01 · UC-LO02 — demande et validation d'une réservation de location.

UC-LO01

Majeure

Demande de location de véhicule

Service : Location · Profil : Client

OBJECTIF

Vérifier qu'un client peut faire une demande de location avec ou sans chauffeur.

ÉTAPES

- Le client choisit le service Location
- Il choisit le type de véhicule
- Il choisit la période
- Il indique avec ou sans chauffeur
- Il valide la demande
- Le système enregistre la demande
- Le partenaire ou central reçoit la demande

RÉSULTATS ATTENDUS

Demande enregistrée · disponibilité vérifiable · notification envoyée · statut visible.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

La demande est routée correctement vers le partenaire propriétaire du véhicule.

UC-LO02

Majeure

Validation d'une demande de location

Service : Location · Profils : Partenaire, Central, Client

OBJECTIF

Tester la validation d'une location par le central ou le partenaire propriétaire.

ÉTAPES

- Le partenaire consulte la demande
- Il vérifie la disponibilité du véhicule
- Il accepte ou rejette
- Le client est informé
- Le statut est mis à jour

RÉSULTATS ATTENDUS

Validation possible · client notifié · véhicule réservé · reporting mis à jour.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Le véhicule est bloqué dans le calendrier dès la validation, pas de double réservation possible.

UC-FIN01 · UC-FIN02 — recharge wallet et débit commission.

UC-FIN01

Critique

Recharge wallet chauffeur / livreur

Service : Finance · Profils : Chauffeur, Livreur, Partenaire, Franchise, Central

OBJECTIF

Vérifier les **3 voies d'alimentation** du wallet chauffeur / livreur. Le central ne recharge PAS.

ÉTAPES — TESTER LES 3 VOIES

Voie 1 — Auto-recharge chauffeur : le chauffeur ouvre son wallet, choisit le montant, paie en mobile money, valide.

Voie 2.a — Recharge wallet partenaire (Mobile Money) : le partenaire crédite son propre wallet via Orange/MTN/Moov/Wave.

Voie 2.b — Recharge wallet partenaire (Carte bancaire) : le partenaire crédite son wallet via CB/Visa.

Voie 2.c — Cascade partenaire → chauffeur : le partenaire sélectionne un de ses chauffeurs et transfère un montant depuis son wallet. Pur transfert interne, aucun mobile money sollicité.

Voie 3 — Bonus franchise (automatique) : en fin de période, la franchise applique son moteur de bonus. Les chauffeurs éligibles voient leur wallet crédité automatiquement (voir UC-FR02).

RÉSULTATS ATTENDUS

Chaque voie crédite correctement le wallet cible · historique trace l'initiateur · cohérence débit/crédit partenaire → chauffeur · bonus franchise crédité sans intervention manuelle.

RÈGLE STRICTE

Aucune action de recharge ne doit être disponible depuis l'interface centrale. Test négatif obligatoire.

UC-FIN02

Critique

Débit de commission après course

Service : Finance · Profils : Chauffeur, Plateforme, Central

OBJECTIF

Vérifier que la commission plateforme est calculée et débitée correctement du wallet chauffeur après chaque course.

ÉTAPES

Un chauffeur réalise une course

Le client paie le chauffeur

La plateforme calcule la commission selon le taux paramétré

Le wallet chauffeur est débité

Le reporting financier est mis à jour

RÉSULTATS ATTENDUS

Recette chauffeur distincte de la commission plateforme · commission selon le taux paramétré · solde wallet exact · historique disponible.

CRITÈRE D'ACCEPTATION


Aucune confusion entre recette course, recharge wallet et commission plateforme dans les rapports.

UC-FIN03 · UC-FIN04 — répartition financière et solde insuffisant.

UC-FIN03

Répartition plateforme / partenaire / franchise / central

Vérifier la logique de répartition financière du modèle UPJUNOO PRO

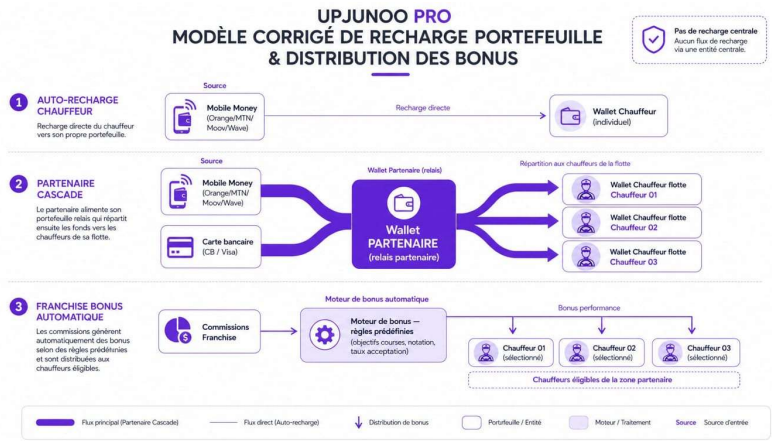

ÉTAPES

- Course par chauffeur rattaché partenaire
- Vérifier la commission plateforme
- Vérifier les parts partenaire / franchise / central
- Consulter le reporting financier

CRITÈRE

Les parts sont correctement calculées et tracées - les rapports affichent les bonnes répartitions - aucune confusion recette/recharge/commission.

Critique

UC-FIN04

Solde insuffisant

Cas non nominal — bloquant pour exploitation

OBJECTIF

Vérifier le comportement plateforme quand le solde chauffeur est insuffisant pour accepter une course.

ÉTAPES

- Créer un chauffeur avec solde faible
- Le mettre en ligne
- Tenter d'accepter une course
- Vérifier le message d'alerte / blocage
- Effectuer une recharge (par n'importe quelle voie)
- Réessayer d'accepter

RÉSULTATS ATTENDUS

Chauffeur alerté ou bloqué selon les règles - recharge permet la reprise d'activité immédiate - solde immédiate - solde fiable - historique complet.

CRITÈRE

Aucune course ne peut être acceptée avec un solde insuffisant.

Critique

UC-P01 · UC-P02 — création / validation et rattachement chauffeur+véhicule.

UC-P01

Majeure

Création & validation partenaire

Service : Administration · Profils : Central, Partenaire

OBJECTIF

Tester la création d'un partenaire et sa validation par le central.

ÉTAPES

- Créer un compte partenaire
- Ajouter les informations entreprise / propriétaire
- Soumettre les documents (KBIS, identité, autorisations)
- Valider depuis le central
- Vérifier l'accès partenaire au back-office

RÉSULTATS ATTENDUS

Compte partenaire créé · statut visible · accès fonctionnel · données visibles au central.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Le partenaire accède à son espace dès validation, avec son périmètre cloisonné.

UC-P02

Critique

Rattachement chauffeur / véhicule

Service : Administration · Profil : Partenaire

OBJECTIF

Vérifier qu'un partenaire peut rattacher ses chauffeurs et véhicules — et que les données restent cloisonnées entre partenaires.

ÉTAPES

- Sélectionner un partenaire (admin / central)
- Rattacher des chauffeurs au partenaire
- Rattacher des véhicules au partenaire
- Réaliser des courses avec ces chauffeurs
- Vérifier le reporting partenaire
- Vérifier qu'un autre partenaire ne voit pas ces données

RÉSULTATS ATTENDUS

Rattachement correct · activité visible côté partenaire · aucun mélange de données entre partenaires · reporting cohérent.

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Cloisonnement strict des données — un partenaire ne voit pas la flotte d'un autre, même au sein de la même franchise.

UC-FR01 — supervision d'une zone franchise & cloisonnement.

UC-FR01

Critique

Supervision d'une zone franchise

Service : Franchise · Profil : Franchise

OBJECTIF

Vérifier que la franchise suit uniquement son périmètre géographique, sans accès aux autres zones, et que ses indicateurs sont cohérents avec l'activité terrain.

PRÉCONDITIONS

- Franchise pilote créée et validée
- Zone configurée (Abidjan principale)
- Partenaires & chauffeurs rattachés à la zone
- Données d'activité existantes

ÉTAPES

- Se connecter avec un compte franchise
- Consulter les partenaires rattachés
- Consulter les chauffeurs & livreurs
- Consulter les courses
- Consulter les commissions
- Exporter un rapport (CSV / Excel)
- Tenter d'accéder à une autre franchise (test négatif)

RÉSULTATS ATTENDUS

- ✓ La franchise voit uniquement sa zone
- ✓ Les données sont cohérentes avec le terrain
- ✓ Les indicateurs sont disponibles en temps réel
- ✓ Les exports sont exploitables
- ✓ Aucun accès aux autres franchises possible

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Cloisonnement strict des données. Toute tentative d'accès à une zone non autorisée doit être bloquée et journalisée dans les logs d'audit.

FOCUS — RECHARGE WALLETS ZONE

Tester la capacité de la franchise à recharger les wallets des chauffeurs et partenaires de sa zone. Cette opération est tracée comme initiateur = franchise dans l'historique transactionnel.

14 Indicateurs zone

Reporting franchise attendu

Activité globale zone

Nb partenaires actifs

Nb chauffeurs actifs

Nb livreurs actifs

Nb clients actifs

Courses réalisées

Livraisons réalisées

Demandes fret

Locations

Chiffre d'activité

Commissions zone

Taux d'annulation

Incidents

Réclamations

EXPORTS

CSV · Excel · PDF — par jour, semaine, mois, période personnalisée.

I. Central & reporting

UC-C01 · UC-C02 · UC-C03 — dashboard, reporting multiservices, réclamations.

UC-C01

Critique

Tableau de bord central

Profil : Central · Direction

OBJECTIF

Vérifier que le central dispose d'une vue globale et filtrable sur toute la plateforme.

ÉTAPES

- Se connecter au central
- Consulter les statistiques globales
- Filtrer par service
- Filtrer par zone
- Filtrer par partenaire
- Filtrer par franchise
- Exporter les données

RÉSULTATS

Données consolidées · filtres fonctionnels · exports exploitables · chiffres cohérents avec les tests terrain.

UC-C02

Critique

Reporting multiservices

Profil : Central · Finance

OBJECTIF

Vérifier le reporting par service et la cohérence des données.

ÉTAPES

- Réaliser des courses, livraisons, fret, locations
- Consulter le reporting central
- Comparer les données réelles & affichées
- Vérifier la ventilation par service
- Vérifier les montants
- Vérifier les statuts

RÉSULTATS

Chaque service est correctement comptabilisé · montants cohérents · statuts exacts · rapports lisibles, rapports lisibles.

CRITÈRE

Aucun écart entre les chiffres affichés et le terrain.

UC-C03

Majeure

Gestion des réclamations

Profil : Support · Central

OBJECTIF

Tester la gestion support des réclamations remontées par tous les profils.

ÉTAPES

- Créer une réclamation client
- Créer une réclamation chauffeur
- Créer une réclamation partenaire
- Traiter depuis le support
- Changer le statut
- Clôturer

RÉSULTATS

Réclamations visibles · traitement possible · historique conservé · reporting support disponible, disponible.

CRITÈRE

SLA support : prise en charge sous 24h en condition de test.

UC-FR02 — Reversement automatique des bonus de performance.

UC-FR02

Critique

Reversement automatique de bonus aux chauffeurs

Service : Franchise · Profils : Franchise, Chauffeur, Central (auditeur)

OBJECTIF

Vérifier que la franchise peut paramétrer un moteur de règles et que les bonus sont reversés automatiquement aux chauffeurs éligibles, sans intervention manuelle, en fin de période d'évaluation.

PRÉCONDITIONS

- Franchise en activité avec commissions perçues
- Chauffeurs rattachés ayant historique d'activité
- Période d'évaluation définie (ex : semaine glissante)
- Paramètres KPI prédéfinis et activés

ÉTAPES DE TEST

- Paramétrer les seuils (courses min, note min, taux accept., taux annul.)
- Définir l'enveloppe budgétaire bonus (% des commissions)
- Définir la grille de montants (palier 1 / 2 / 3)
- Activer le moteur
- Laisser tourner une période d'activité
- Déclencher le calcul de fin de période
- Vérifier le crédit automatique des wallets éligibles
- Consulter le rapport bonus généré

4 KPI PRÉDÉFINIS — EXEMPLE

Nb de courses	≥ 50 / semaine
Note moyenne	≥ 4.5 / 5
Taux d'acceptation	≥ 90 %
Taux d'annulation	≤ 5 %

RÉSULTATS ATTENDUS

- ✓ Moteur évalue chaque chauffeur de la zone
- ✓ Wallets éligibles crédités automatiquement
- ✓ Wallet franchise débité du montant total
- ✓ Notification au chauffeur ("Bonus reçu : X FCFA")
- ✓ Rapport bonus exporté par la franchise
- ✓ Logs d'audit horodatés

CRITÈRE D'ACCEPTATION

Tout chauffeur remplissant les 4 KPI reçoit son bonus sans intervention humaine. Tout chauffeur Tout chauffeur en-dessous d'un seuil ne reçoit rien et apparaît dans le rapport "non éligibles". éligibles".

Schéma simplifié

Flux du bonus

ÉTAPE A

Franchise perçoit commission

Pourcentage automatique de chaque course / livraison de la zone.



ÉTAPE B

Moteur évalue les KPI

Cron en fin de période, sur l'historique des chauffeurs de la zone.



ÉTAPE C

Wallets crédités automatiquement

Notification + rapport bonus généré.

UC-S01 — Traitement d'une réclamation multiservices.

UC-S01

Majeure

Cycle complet d'une réclamation

Service : Support · Profils : Client / Chauffeur / Livreur / Partenaire (émetteur), Support, Finance, Central

OBJECTIF

Tester le cycle complet de prise en charge d'une réclamation, de sa création par un utilisateur jusqu'à sa résolution avec éventuel remboursement ou crédit wallet.

PRÉCONDITIONS

- Compte utilisateur actif
- Historique de course / livraison disponible
- Agent support connecté
- Catégories de réclamation paramétrées

ÉTAPES DE TEST

Émetteur crée une réclamation (catégorie, course concernée, description, pièces jointes)
Le support reçoit la notification & voit la réclamation dans sa file
Agent support assigne la réclamation et change le statut → "En cours"
Agent communique avec l'émetteur (chat interne, mail)
Si dédommagement : validation finance + crédit wallet du client
Si rejet : motif documenté, notification émetteur
Clôture : changement de statut → "Résolue" + horodatage
Émetteur reçoit notification de résolution et peut noter le service

CATÉGORIES À TESTER

Course non effectuée	Surfacturation
Comportement chauffeur	Colis endommagé
Colis perdu	Wallet incorrect
Commission contestée	Autre

SLA SUPPORT — RÈGLES DE TEST

- Prise en charge sous **24h**
- Première réponse sous **4h ouvrées**
- Résolution sous **72h** (catégorie standard)
- Escalade central si non résolu sous **5j**

RÉSULTATS ATTENDUS

Tous les statuts changent correctement · notifications reçues · crédit wallet effectif si dédommagement · historique conservé · reporting support alimenté.

CRITÈRE

Aucune réclamation ne peut être clôturée sans motif documenté ET sans notification à l'émetteur. à l'émetteur.

Cinématique multi-profil

Qui fait quoi

ÉMETTEUR

Client · Chauffeur · Livreur · Partenaire

Crée la réclamation, fournit les pièces, suit l'avancement, note le traitement.

SUPPORT N1

Agent support

Qualifie, instruit, communique, propose une solution ou escalade.

FINANCE

Équipe finance

Valide les remboursements / crédits wallet de plus de N FCFA.

CENTRAL (escalade)

Direction projet

Tranche les cas non résolus ou contestés > 5 jours.

UC-A01 — Paramétrage tarifs, commissions & règles de bonus.

UC-A01a

Critique

Paramétrage des tarifs

Profil : Central · Service : Tous

ÉTAPES

- Accès interface paramétrage
- Sélection service (VTC / livraison / fret / location)
- Saisie tarif de base, prix km, attente, surcharge nuit
- Définition zone & catégorie véhicule
- Activation à date
- Vérification application sur nouvelles courses

RÉSULTATS

Tarifs appliqués aux nouvelles courses · anciens tarifs conservés pour les courses en cours · historique cours · historique versionné.

CRITÈRE

Versioning obligatoire avec date d'application.

UC-A01b

Critique

Paramétrage des commissions

Profil : Central · Service : Tous

ÉTAPES

- Saisie % commission plateforme
- Saisie % commission partenaire
- Saisie % commission franchise
- Vérification cumul $\leq 100\%$
- Application différenciée par service
- Test sur une course : vérifier la ventilation

EXEMPLE DE RÉPARTITION

Chauffeur	75 %
Plateforme	10 %
Partenaire	10 %
Franchise	5 %

CRITÈRE

Validation arithmétique sur chaque transaction de test.

UC-A01c

Critique

Règles de bonus de performance

Profil : Central · Cible : Franchises

ÉTAPES

- Définition gabarit de KPI globaux
- Définition plage acceptable par KPI
- Définition fréquence d'évaluation
- Validation par direction
- Publication aux franchises
- Les franchises personnalisent dans la plage

GABARIT KPI

- Nb courses (plage 30–80 / sem)
- Note (plage 4.0 – 5.0)
- Acceptation (plage 80–95 %)
- Annulation (plage 2–10 %)

CRITÈRE

Les franchises ne peuvent pas sortir des plages globales (garde-fou central).

VOIR AUSSI

[UC-FR02](#)

UC-AU01 — Audit des transactions et journalisation des actions sensibles.

UC-AU01

Critique

Audit transactions & journalisation

Service : Conformité · Profils : Auditeur, Direction, Central

OBJECTIF

Vérifier que **toute action sensible** est journalisée de manière inviolable et que le profil auditeur peut consulter, filtrer et exporter l'historique pour contrôle ou enquête.

ÉTAPES DE TEST

Réaliser une action sensible (connexion admin, modification tarif, recharge wallet, suspension chauffeur)

Se connecter avec un profil auditeur

Ouvrir le journal d'audit

Filtrer par : type d'action, profil, période, IP

Identifier l'action de test

Vérifier les attributs (qui, quoi, quand, depuis où, valeur avant/après)

Exporter (PDF / CSV) un extrait

Tenter une modification rétroactive : doit être impossible

TEST NÉGATIF OBLIGATOIRE

Vérifier que les logs d'audit ne sont jamais modifiables, même par un super-administrateur. Toute tentative doit être bloquée et générer elle-même un événement d'audit.

ÉVÉNEMENTS À JOURNALISER

- Connexions administrateurs (réussies / échecs)
- Modifications tarifs & commissions
- Recharges wallets (toutes voies)
- Reversements bonus franchise
- Suspensions / réactivations comptes
- Validations partenaires / franchises
- Modifications de rôles & droits
- Exports financiers
- Suppressions de données
- Accès à des données personnelles
- Acceptation / rejet réclamation avec dédommagement

RÉSULTATS ATTENDUS

- ✓ Toute action sensible apparaît dans le journal
- ✓ Champs complets : qui, quoi, quand, IP, valeur avant/après
- ✓ Filtres & recherche fonctionnels
- ✓ Export CSV/PDF opérationnel
- ✓ Aucune modification rétroactive possible
- ✓ Rétention conforme à la politique (min. 12 mois)

CRITÈRE

Inviolabilité des logs + traçabilité complète + capacité d'export pour audit externe.

Profil Auditeur

Droits & périmètre

PEUT

- ✓ Consulter tous les logs d'audit
- ✓ Filtrer, rechercher, exporter
- ✓ Consulter (lecture seule) toutes les transactions
- ✓ Voir l'historique d'un compte
- ✓ Générer un rapport d'enquête

NE PEUT PAS

- X Modifier un log
- X Supprimer un log
- X Modifier des tarifs / commissions
- X Recharger ou débiter un wallet
- X Suspendre un compte

RÉTENTION

Logs conservés ≥ 12 mois · sauvegardés sur 2 sites distincts.


40 engins répartis sur 4 services — couverture multiservices intégrale.




Type d'engin	Nombre	Usage en journée test
Taxis / VTC	20	Courses clients · tester UC-T01 à UC-T05
Motos / livreurs	10	Livraisons · tester UC-L01 à UC-L04
Véhicules location	5	Réservations & location avec/sans chauffeur · tester UC-LO01, UC-LO02
Véhicules fret	5	Transport de marchandises · tester UC-F01, UC-F02
TOTAL	40 engins	Couverture multiservices intégrale — tous les services en simultané

19.2 · Participants à mobiliser

~90 participants — 5 catégories d'acteurs terrain et équipes pilotes.

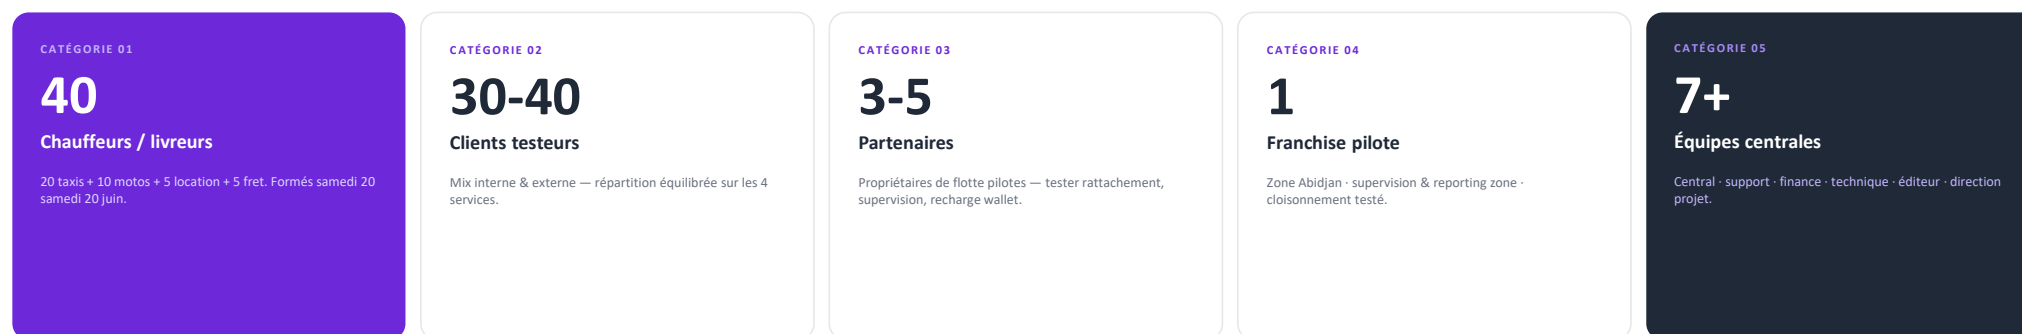


Composition détaillée des équipes encadrantes



20. Déroulement journée test


Dimanche 21 juin 2026 — chronogramme 08h00 → 19h00.

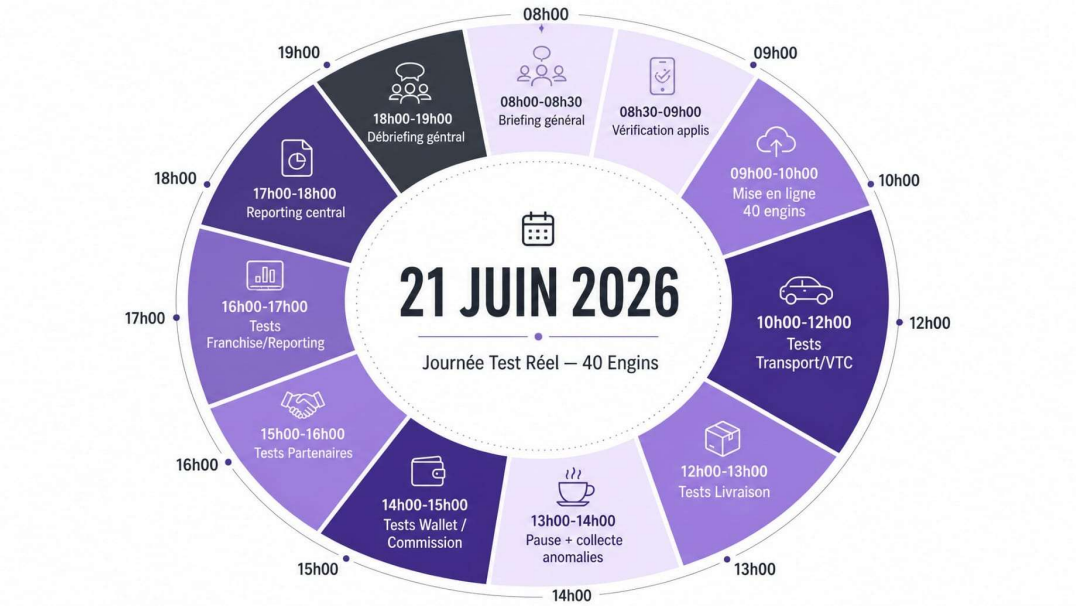

11 séquences chronométrées	
08h00-08h30	Briefing général Chef de projet · Direction
08h30-09h00	Vérification applications & connexions Technique · Support
09h00-10h00	Mise en ligne des 40 engins Exploitation — 40 visibles en ligne
10h00-12h00	Tests Transport · Taxi · VTC Clients · Chauffeurs (20 engins)
12h00-13h00	Tests Livraison Clients · Livresseurs (10 motos)
13h00-14h00	Pause + collecte anomalies intermédiaire Support · Technique
14h00-15h00	Tests Wallet · Commission · Solde insuffisant Finance · Chauffeurs
15h00-16h00	Tests Partenaires Partenaires · Central
16h00-17h00	Tests Franchise & reporting zone Franchise · Central
17h00-18h00	Tests Reporting central consolidé Direction · Finance
18h00-19h00	Débriefing général — synthèse anomalies Tous les participants

21. Planning détaillé — Phase 1/2

Du jeudi 18 juin au dimanche 21 juin 2026 — préparation & test réel.

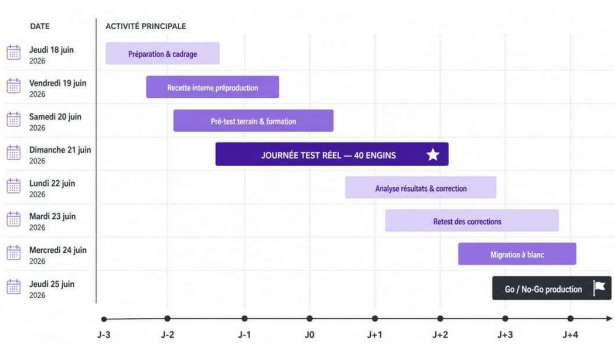

J-3 JEUDI
18 juin 2026

Préparation & cadrage

- Validation du plan de recette
- Confirmation version éditeur
- Vérification accès préprod
- Préparation comptes tests
- Définition zones de test
- Confirmation 40 engins
- Mise en place registre anomalies

LIVRABLES

Liste testeurs · liste engins · accès préprod · grille recette · planning confirmé.

J-2 VENDREDI
19 juin 2026

Recette interne préprod

- Installation applis pilotes
- Tests OTP client / chauffeur
- Tests création comptes
- Tests validation administrative
- Tests demandes 4 services
- Tests wallet · commission
- Tests reporting · réclamations
- Correction anomalies bloquantes

LIVRABLES

Rapport recette interne · listes anomalies critiques & majeures · décision poursuite.

J-1 SAMEDI
20 juin 2026

Pré-test terrain & formation

- Formation chauffeurs
- Formation livreurs
- Formation partenaires
- Briefing franchise
- Briefing support & finance
- Test connexion tous participants
- Vérification GPS · data · wallet
- Tests courses & livraisons à blanc

LIVRABLES + DÉCISION

Feuille de présence · checklist validée · Go / No-Go pour J0.

J0 DIMANCHE ★
21 juin 2026

Journée de test réel

- Mise en ligne des 40 engins
- Tests Transport · Livraison
- Tests Fret · Location
- Tests Partenaires & Franchise
- Tests Wallet · Commission
- Tests Reporting central
- Tests Réclamations
- Suivi anomalies · débriefing

LIVRABLES

Rapport test réel · listes activités · rapports wallet · rapports partenaires & franchise · recommandations.

21. Planning détaillé — Phase 2/2

Du lundi 22 juin au jeudi 25 juin 2026 — analyse, retest, migration à blanc, Go/No-Go.

J+1 LUNDI
22 juin 2026

Analyse résultats & correction prioritaire

ACTIVITÉS

- Consolidation des anomalies
- Classement par criticité
- Analyse technique avec éditeur
- Analyse métier avec exploitation
- Analyse financière
- Correction des anomalies critiques
- Préparation des retests

LIVRABLES

- Rapport d'analyse
- Plan de correction
- Liste anomalies bloquantes
- Liste anomalies acceptables
- Planning de retest

J+2 MARDI
23 juin 2026

Retest des corrections

ACTIVITÉS

- Retest anomalies critiques
- Retest wallet
- Retest commission
- Retest reporting
- Retest connexion utilisateurs
- Retest partenaires
- Retest franchise
- Validation ou rejet des corrections

LIVRABLES

- Rapport de retest
- Anomalies clôturées
- Anomalies restantes
- Avis technique provisoire

J+3 MERCREDI
24 juin 2026

Migration à blanc

ACTIVITÉS

- Extraction données production
- Copie contrôlée → préprod
- Mapping anciennes/nouvelles
- Migration test
- Contrôle clients · chauffeurs
- Contrôle partenaires · véhicules
- Contrôle soldes wallet
- Contrôle historiques · documents

LIVRABLES

- Rapport migration à blanc
- Écarts détectés
- Temps de migration estimé
- Points de correction
- Recommandation basculement

J+4 JEUDI ☼
25 juin 2026

Go / No-Go migration production

ACTIVITÉS

- Revue des rapports
- Revue des anomalies
- Revue rapport financier
- Revue rapport technique
- Revue rapport exploitation
- Validation plan retour arrière
- Validation plan communication
- Décision mise en production

LIVRABLES DÉCISION

- Procès-verbal Go / No-Go
- Liste des réserves
- Plan d'action final
- Décision direction

Critères de validation de la recette

4 familles de critères — la recette est validée si toutes le sont.

§22

Fonctionnels

La recette fonctionnelle est validée si :

- ✓ Clients utilisent les services
- ✓ Chauffeurs terminent leurs courses
- ✓ Livreurs terminent leurs livraisons
- ✓ Partenaires suivent leurs engins
- ✓ Franchises suivent leur zone
- ✓ Central supervise tout
- ✓ Statuts cohérents
- ✓ Historiques disponibles
- ✓ Notifications reçues
- ✓ Réclamations traitables

§23

Techniques

La recette technique est validée si :

- ✓ Pas de crashes répétés
- ✓ APIs répondent correctement
- ✓ Temps de réponse acceptables
- ✓ Géolocalisation fonctionne
- ✓ Notifications fonctionnent
- ✓ Logs exploitables
- ✓ Accès sécurisés
- ✓ Sauvegardes disponibles
- ✓ Préproduction stable

§24

Financiers

La recette financière est validée si :

- ✓ Recharges wallet correctes
- ✓ Soldes exacts
- ✓ Commissions calculées
- ✓ Parts plateforme exactes
- ✓ Parts partenaire exactes
- ✓ Parts franchise exactes
- ✓ Parts central exactes
- ✓ Rapports cohérents
- ✓ Exports exploitables
- ✓ Aucune confusion recette/recharge/commission

§25


Reporting

La recette reporting est validée si :

- ✓ Tableaux de bord cohérents
- ✓ Données par service fiables
- ✓ Données par profil visibles
- ✓ Données par partenaire exactes
- ✓ Données par franchise exactes
- ✓ Données centrales consolidées
- ✓ Filtres fonctionnels
- ✓ Exports exploitables

26. Classification des anomalies

4 niveaux de gravité — décision automatique selon classification.

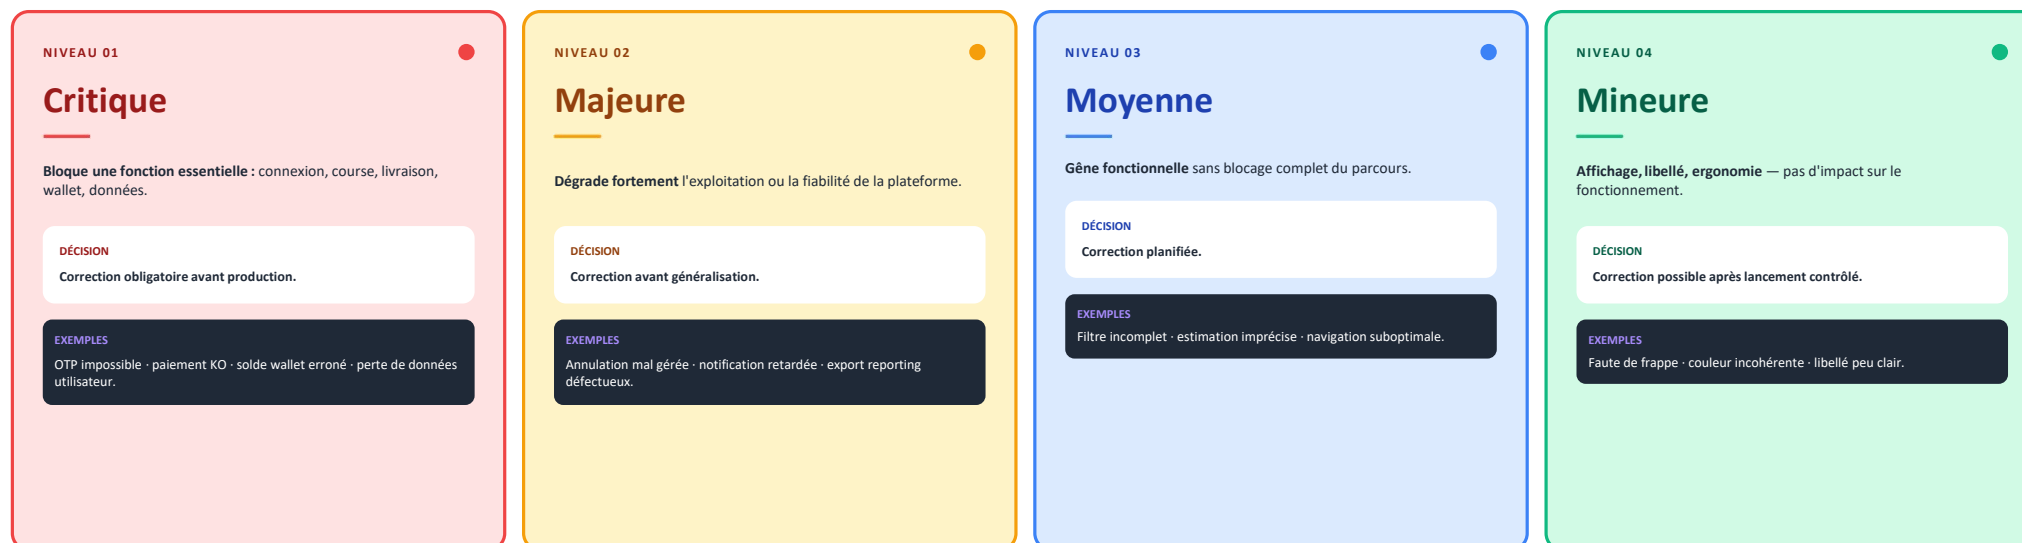

Règle simple — règle d'or

Anomalies critiques : 0 toléré · Majeures : arbitrage direction · Moyennes & mineures : backlog post-lancement.

Une seule anomalie de niveau "Critique" en suspens suffit à reporter le Go production. Le procès-verbal du J+4 documente chaque arbitrage avec son justificatif technique et métier.

15 champs obligatoires par anomalie — gabarit standard.

Le registre est tenu à jour en temps réel pendant toutes les phases de recette et de test réel. Chaque entrée est traçable et liée à un use case.

ANO-XXXX

Titre de l'anomalie

Critique

01 - RÉFÉRENCE

Code unique ANO-XXXX

02 - DATE

JJ/MM/AAAA

03 - HEURE

HH:MM

04 - MODULE

Auth · Transport · Livraison · Wallet...

05 - PROFIL CONCERNÉ

Client, chauffeur, livreur, central...

06 - SERVICE CONCERNÉ

Transport, livraison, fret, location...

07 - DESCRIPTION

Description claire du comportement observé vs attendu.

08 - ÉTAPES DE REPRODUCTION

1. ... 2. ... 3. ... (étapes numérotées et reproductibles).

09 - CAPTURE ÉCRAN

Référence du fichier joint

10 - GRAVITÉ

Critique · Majeure · Moyenne · Mineure

11 - RESPONSABLE

Nom de l'attributaire

12 - STATUT

Ouvert · En cours · Corrigé · Vérifié · Clos

13 - DATE DE CORRECTION

JJ/MM/AAAA

14 - RÉSULTAT DU RETEST

OK · KO · Reporté

15 - DÉCISION FINALE

Validée pour production · Reportée · Accepté en l'état (avec justification).

Sortie attendue

Tableau de bord anomalies

PAR GRAVITÉ

Distribution Critique / Majeure / Moyenne / Mineure

PAR MODULE

Identifier les modules les plus impactés

PAR STATUT

Ouvert · en cours · corrigé · clos

SLA CORRECTION

Temps moyen de résolution par gravité


CONDITION DE GO PRODUCTION

Toutes les anomalies Critiques doivent être en statut "Vérifié" ou "Clos" avec retest OK.

28-30. Plan de migration en production

6 étapes — de l'audit des données jusqu'au contrôle post-migration.

Objectif : transférer les données de la version actuelle vers la nouvelle **sans perte, sans corruption, sans doublon** et sans impact majeur sur les utilisateurs déjà inscrits.

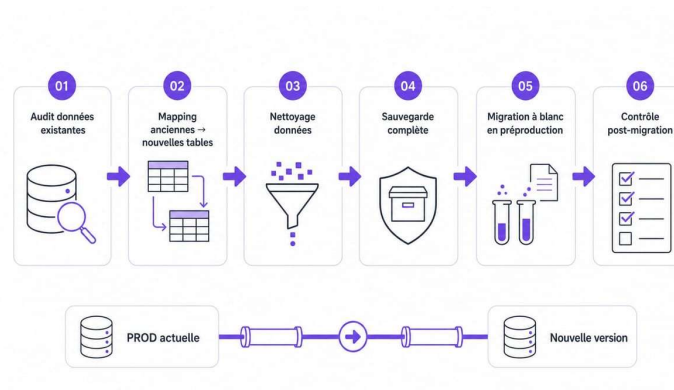

01

Audit données existantes

Comptage clients, chauffeurs, livreurs, partenaires, partenaires, franchises, véhicules, wallets, transactions. Détection doublons, comptes incomplets, incomplets, soldes incohérents.

02

Mapping des données

Anciennes vs nouvelles tables, champs équivalents, transformations, valeurs par défaut, règles de rattachement.

03

Nettoyage des données

Correction formats téléphone, suppression doublons, doublons, correction statuts, vérification rattachements, contrôle soldes.

04

Sauvegarde complète

BDD · documents · images · logs · exports financiers · financiers · configurations · scripts · paramétrages. paramétrages.

05

Migration à blanc

Exécution en préprod : temps de migration, nb lignes, lignes, erreurs, écarts, soldes, comptes, historiques. historiques.

06

Contrôle post-migration

Comparaison ligne à ligne : clients, chauffeurs, partenaires, soldes wallet, transactions, documents, documents, statuts.

[→ Programmation](#)

La migration à blanc est exécutée le **mercredi 24 juin 2026** en préproduction · la migration réelle suit après validation Go/No-Go du jeudi 25 juin.

5 grands ensembles de données à migrer — chacun contrôlé en post-migration.

01

Clients

· Identifiants

· Noms

· Téléphones

· Emails

· Statuts

· Historique courses / livraisons

· Réclamations

· Préférences (si disponibles)

CONTRÔLE

Nombre identique ou écart justifié

02

Chauffeurs & Livreurs

· Identifiants

· Infos personnelles

· Téléphones · emails

· Documents (permis, CNI...)

· Statuts

· Véhicules associés

· Wallet & soldes

· Transactions

· Historique d'activité

CONTRÔLE

Soldes wallet identiques · documents accessibles

03

Partenaires

· Identité

· Contacts

· Chauffeurs rattachés

· Véhicules rattachés

· Activité historique

· Commissions perçues

· Statuts

CONTRÔLE

Rattachements conservés intégralement

04

Franchises

· Zones géographiques

· Partenaires rattachés

· Chauffeurs / livreurs

· Données financières

· Historique reporting

· Configurations zone

CONTRÔLE

Zones conservées intégralement

05

Données financières

· Wallets & soldes

· Recharges (4 voies)

· Débits commissions

· Transactions complètes

· Soldes & exports

· Rapports historiques

CONTRÔLE

Cohérence financière 100% — aucun écart toléré

Contrôle post-migration — tableau de référence (\$30.6)

Clients ✓ Nb identique	Chauffeurs ✓ Nb identique	Livreurs ✓ Nb identique	Partenaires ✓ Rattachements OK	Franchises ✓ Zones OK
Véhicules ✓ Liens conservés	Wallets ✓ Soldes identiques	Transactions ✓ Historiques OK	Documents ✓ Fichiers accessibles	Statuts ✓ Statuts conservés

31. & 32. Basculement sans impact utilisateur

10 mesures obligatoires pour préserver les utilisateurs déjà inscrits.

31. Mesures obligatoires

10 garde-fous pour les utilisateurs existants

- | | |
|--|---|
| 01 Numéros de téléphone
conservés comme identifiants principaux | 02 Pas de recréation forcée
des comptes — l'utilisateur ne refait pas son inscription |
| 03 Soldes wallet préservés
au centime près, source de la recharge tracée | 04 Statuts préservés
actif · suspendu · documents en attente |
| 05 Rattachements partenaires
conservés — un chauffeur reste lié à son partenaire | 06 Historiques critiques préservés
courses, livraisons, transactions, recharges |
| 07 Documents préservés
permis, CNI, KBIS — accessibles dans la nouvelle version | 08 Reconnexion simple par OTP
— pas de mot de passe à recréer |
| 09 Assistance dédiée
renforcée sur les 7 premiers jours post-bascule | 10 Message d'information clair
envoyé à tous (in-app, SMS, email) |

32. Communication utilisateurs

Message officiel recommandé

EXTRAIT

« Cher utilisateur, UPJUNOO PRO procède à une mise à jour majeure de sa plateforme afin d'améliorer la stabilité, la qualité du service et l'expérience utilisateur.

Votre compte reste conservé. Il pourra vous être demandé de mettre à jour l'application ou de vous reconnecter par OTP.

Notre assistance reste disponible pour vous accompagner. »

CANAUX D'ENVOI

In-app banner SMS Email Notification push

CALENDRIER

- J-7 : information préalable
- J-1 : rappel + lien APK nouvelle version
- J0 : confirmation + assistance dédiée
- J+7 : bilan satisfaction

33. Plan de retour arrière (rollback)

8 déclencheurs · 6 actions séquencées · 0 perte de donnée garantie.

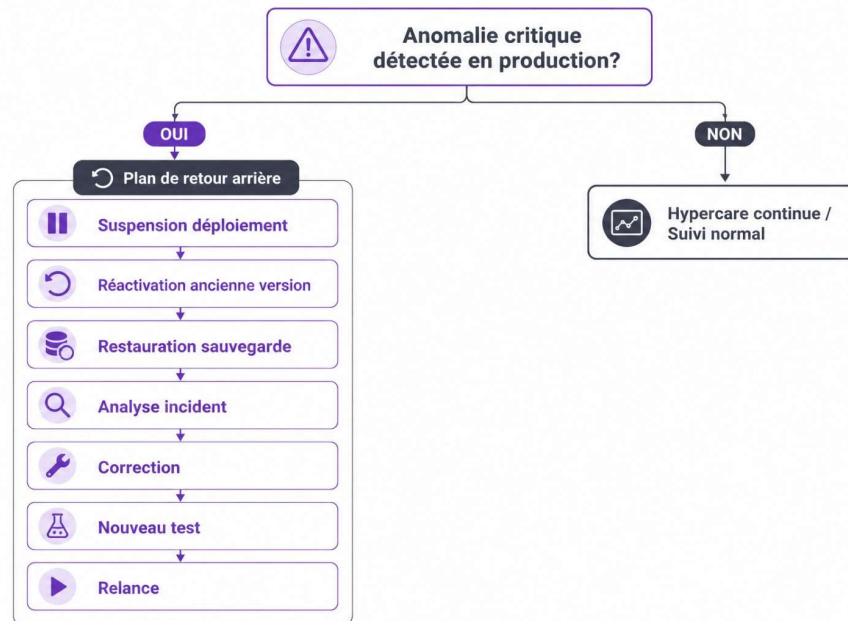


Fig. 53.1 — Arbre de décision rollback : OUI → réactivation ancienne version · NON → hypercare continue

8 DÉCLENCHEURS DE ROLLBACK

Si l'un de ces critères est observé en production

- X Connexion impossible (majorité)
- X Livraisons impossibles
- X Données perdues
- X Plateforme instable
- X Courses impossibles
- X Wallets incohérents
- X Commissions fausses
- X Reporting inutilisable

6 ACTIONS SÉQUENCÉES

Si rollback déclenché

- 01 Suspension du déploiement
- 02 Réactivation de l'ancienne version
- 03 Restauration de la sauvegarde
- 04 Analyse de l'incident (root cause)
- 05 Correction
- 06 Nouveau test avant relance

34. à 36. · Hypercare & livrables

Hypercare 15-30 jours post-bascule & livrables complets de recette + migration.

34. Période d'hypercare — 15 à 30 jours après mise en production

Indicateurs techniques

- Disponibilité plateforme
- Crashes application
- Erreurs API
- Temps de réponse
- Échec OTP
- Échec notification
- Erreurs paiement
- Erreurs GPS

Indicateurs opérationnels

- Chauffeurs / livreurs connectés
- Courses demandées
- Courses acceptées
- Courses terminées
- Livraisons terminées
- Demandes annulées
- Réclamations
- Temps moyen d'affectation

Indicateurs financiers

- Recharges wallet
- Débits commissions
- Soldes
- Transactions échouées
- Écarts financiers
- Commissions plateforme
- Commissions partenaires
- Commissions franchises

35. & 36. Livrables attendus — recette + migration

§35 — Livrables de recette (14)

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| · Plan de recette | · Liste des use cases |
| · Liste des comptes test | · Liste des engines |
| · Liste des partenaires | · Liste des franchises |
| · Grille de test | · Registre anomalies |
| · Rapport recette interne | · Rapport test réel |
| · Rapport financier | · Rapport reporting |
| · Rapport technique | · Rapport de validation |

§36 — Livrables de migration (11)

- | | |
|--|---------------------------------|
| · Cartographie des données | · Script de migration |
| · Rapport migration à blanc | · Rapport de sauvegarde |
| · Rapport contrôle soldes | · Rapport contrôle utilisateurs |
| · Rapport contrôle partenaires | · Rapport contrôle franchises |
| · Procès-verbal Go / No-Go | · Plan de retour arrière |
| · Rapport post-déploiement (hypercare) | |

Total 25 livrables documentaires tracés, signés et archivés à l'issue de l'opération.

Conclusion & feuille de route

Un projet de migration stratégique, pas une simple mise à jour.

Le redéveloppement total de UPJUNOO PRO représente une opportunité majeure de fiabiliser la plateforme, la plateforme, d'améliorer l'expérience utilisateur et de structurer durablement l'exploitation multiservices. La réussite du basculement dépendra de la rigueur de la recette, de la qualité de la journée du **dimanche 21 juin 2026** et de la maîtrise des données existantes.

→ 4 jalons clés du projet

J-3 - 18 JUIN

Préparation

J0 - 21 JUIN ★

Test réel — 40 engins

J+3 - 24 JUIN

Migration à blanc

J+4 - 25 JUIN ✨

Go / No-Go production

7 services multiservices

29 use cases

59 sections documentées

25 livrables

FIN DU DOCUMENT — UPJUNOO PRO · NOUVELLE VERSION MULTISERVICES · 2026

